

# **XI Comité de Operaciones del Puerto**

---

**Noviembre 26, 2019**




**COATZACOALCOS**

COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

# ARRIBO DE BUQUES


Enero – Octubre  
2018/2019

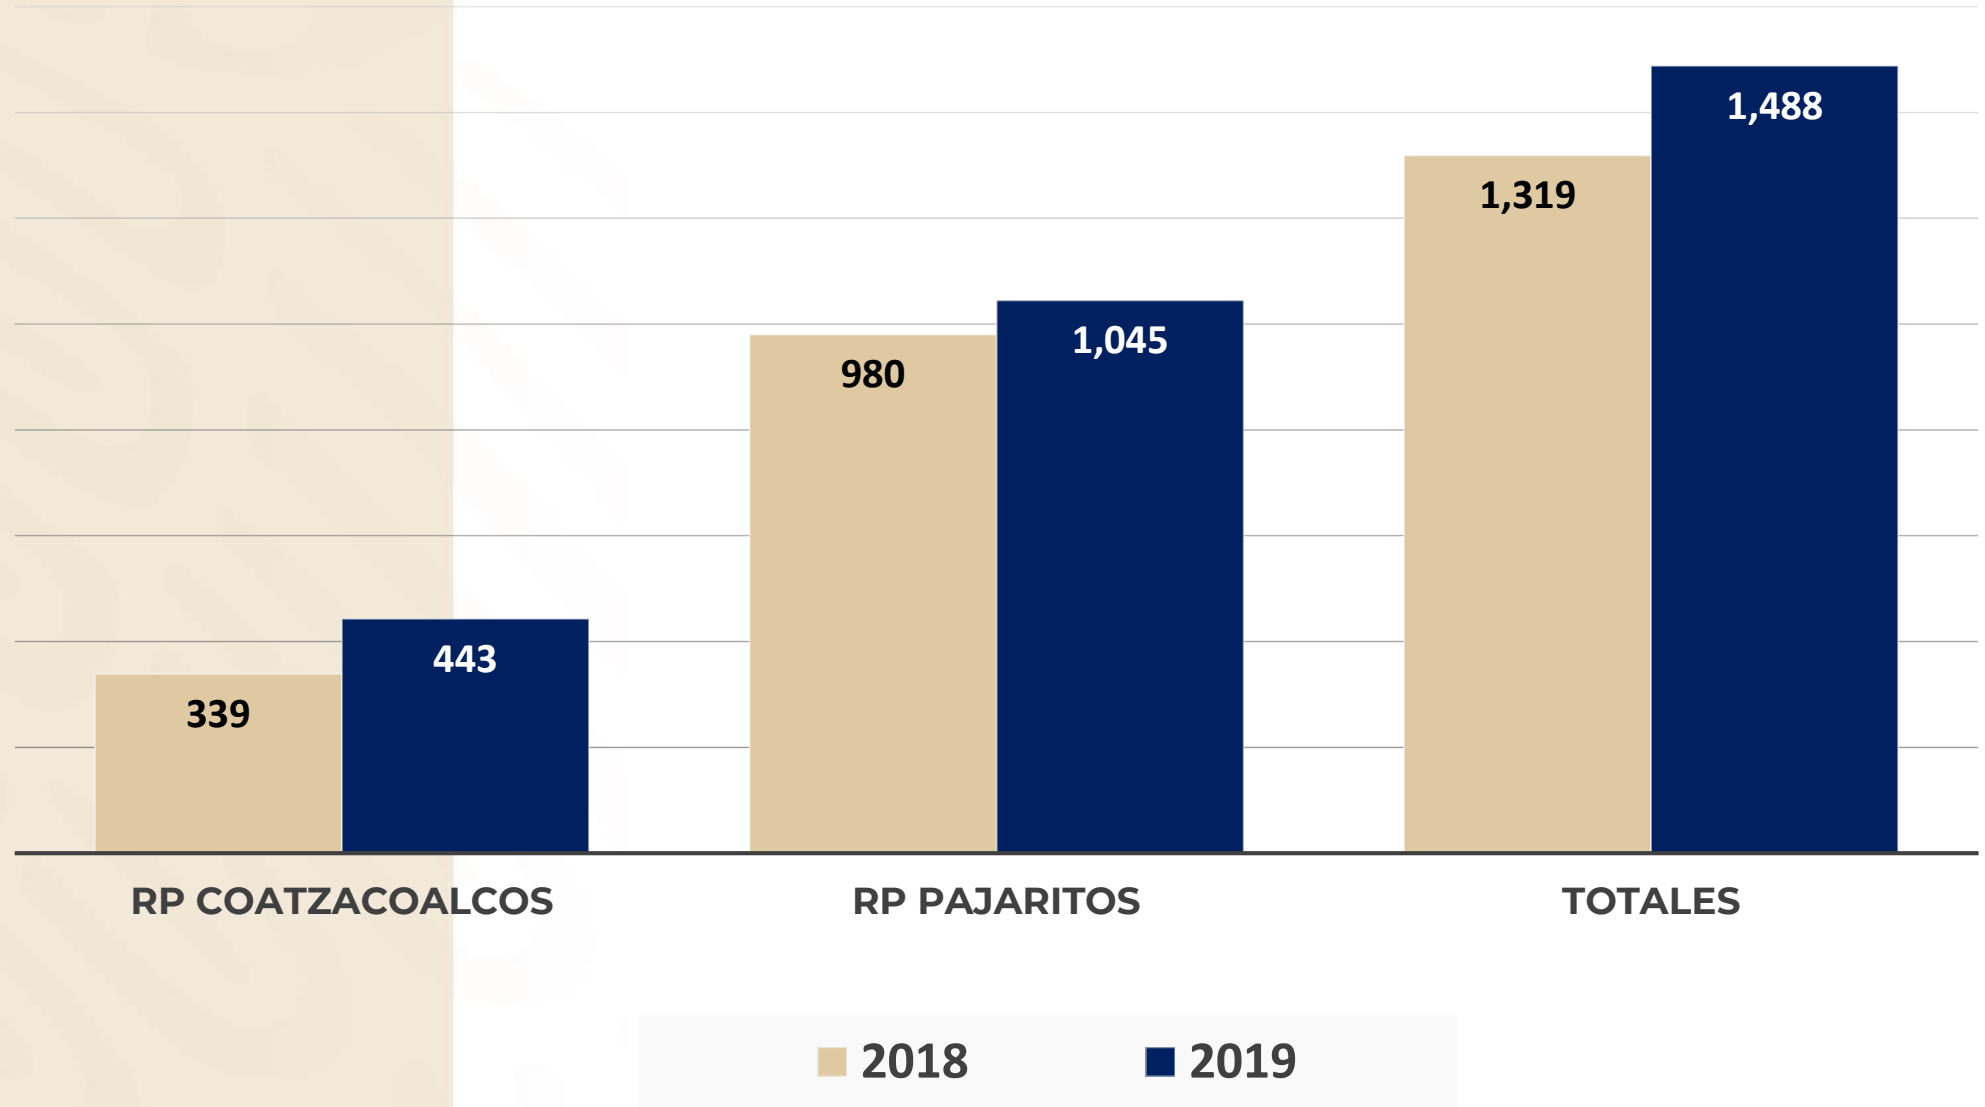

# PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS

Enero - Octubre  
2018/2019


(Miles de toneladas)

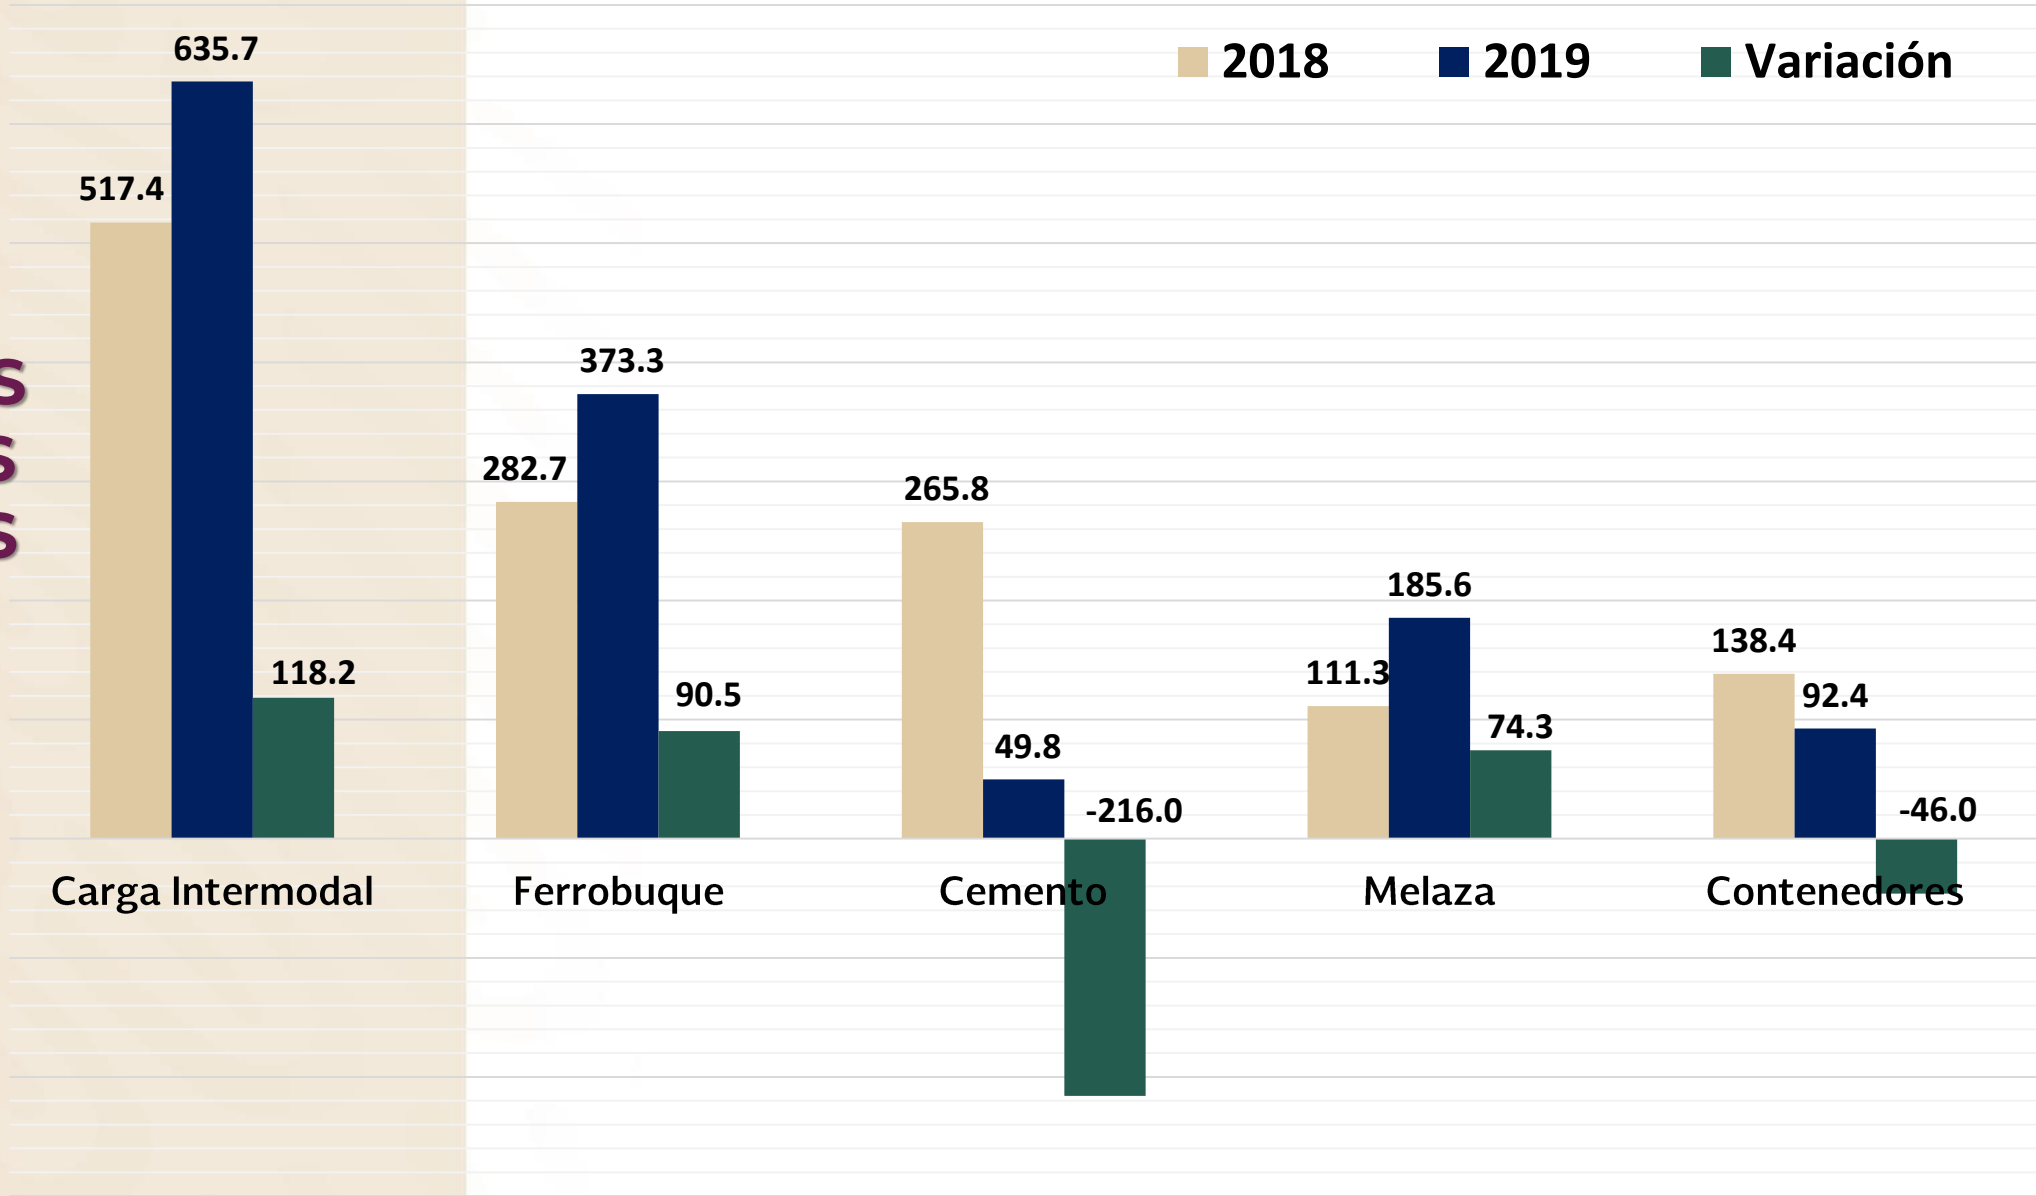

# PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS

Enero - Octubre  
2018/2019


(Miles de toneladas)

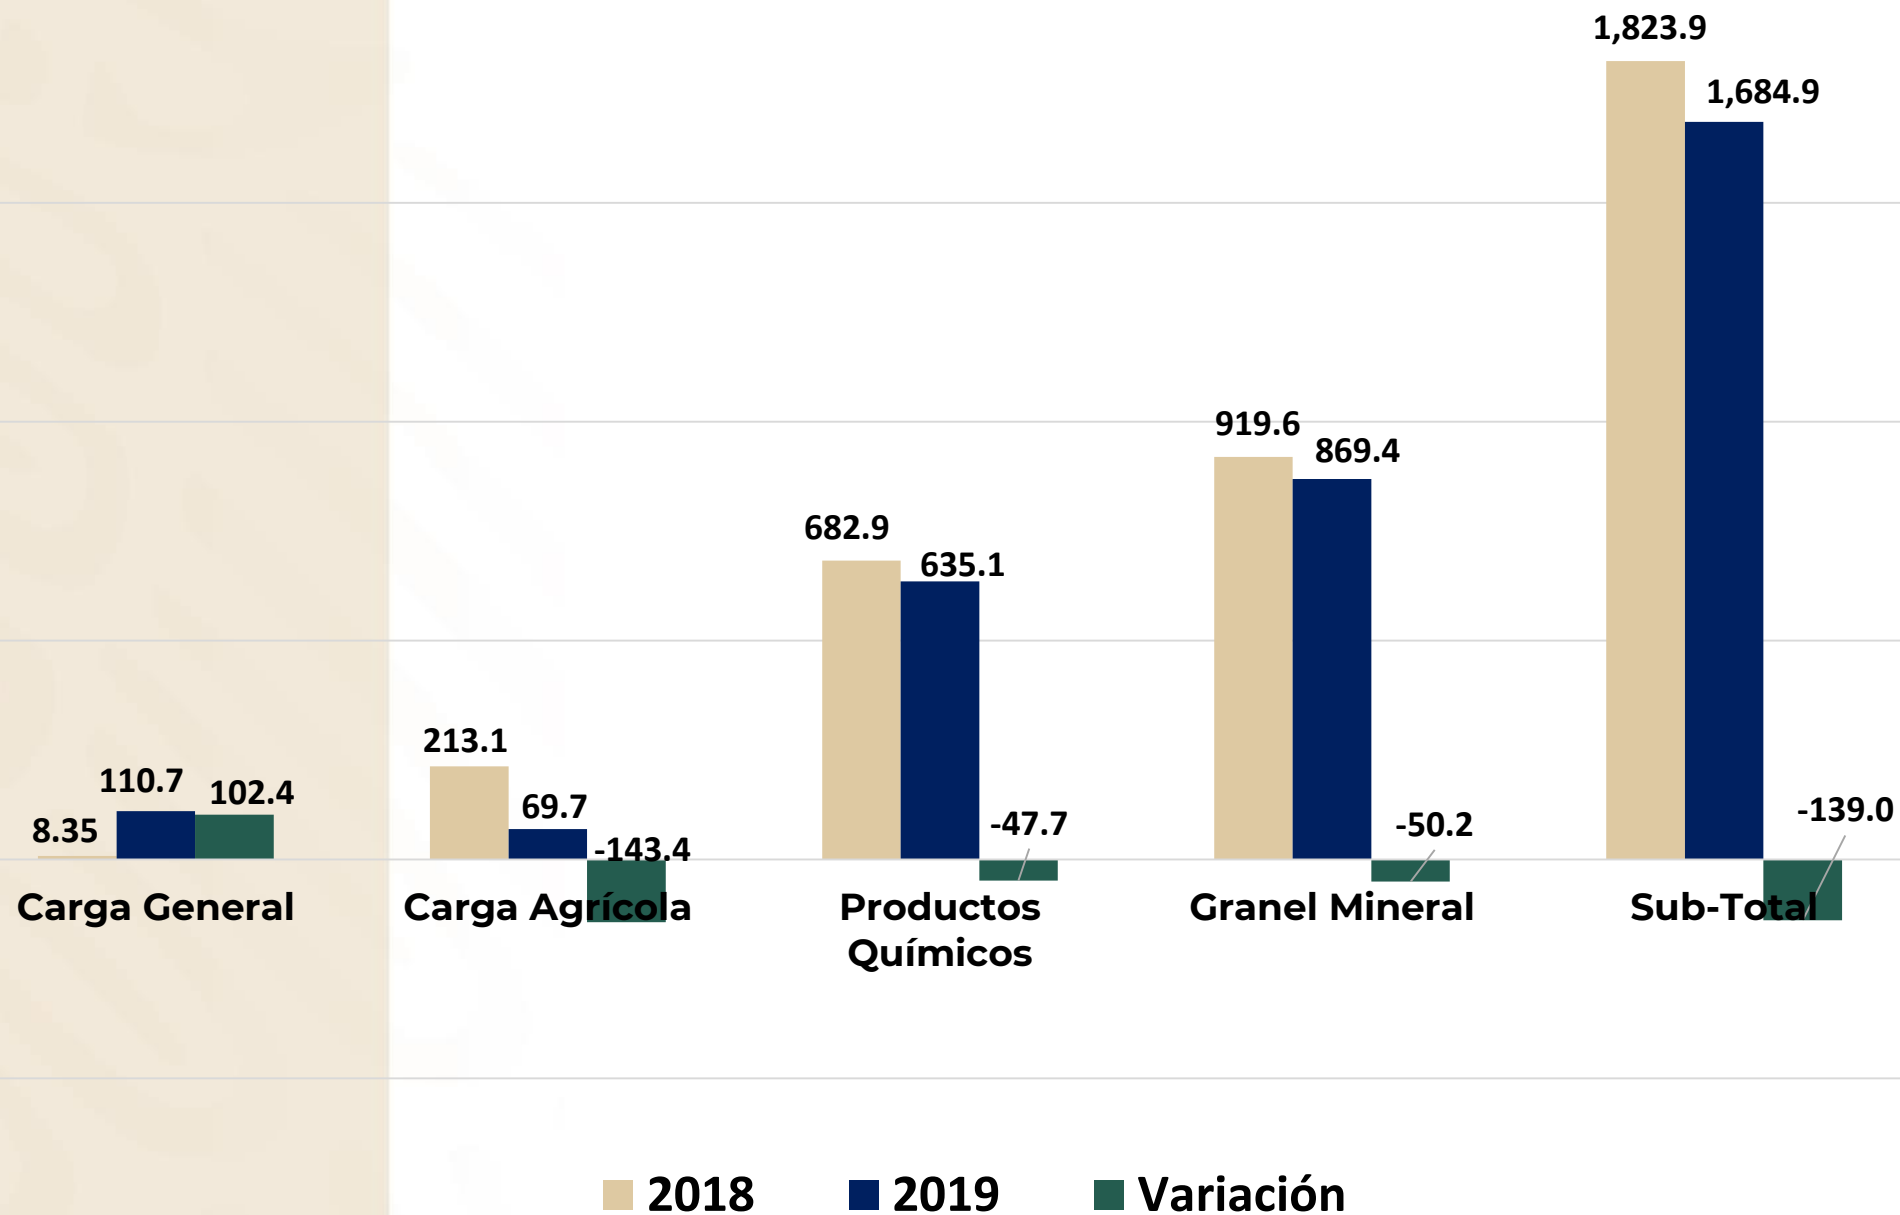


# PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS

Enero - Octubre  
2018/2019


(Miles de toneladas)

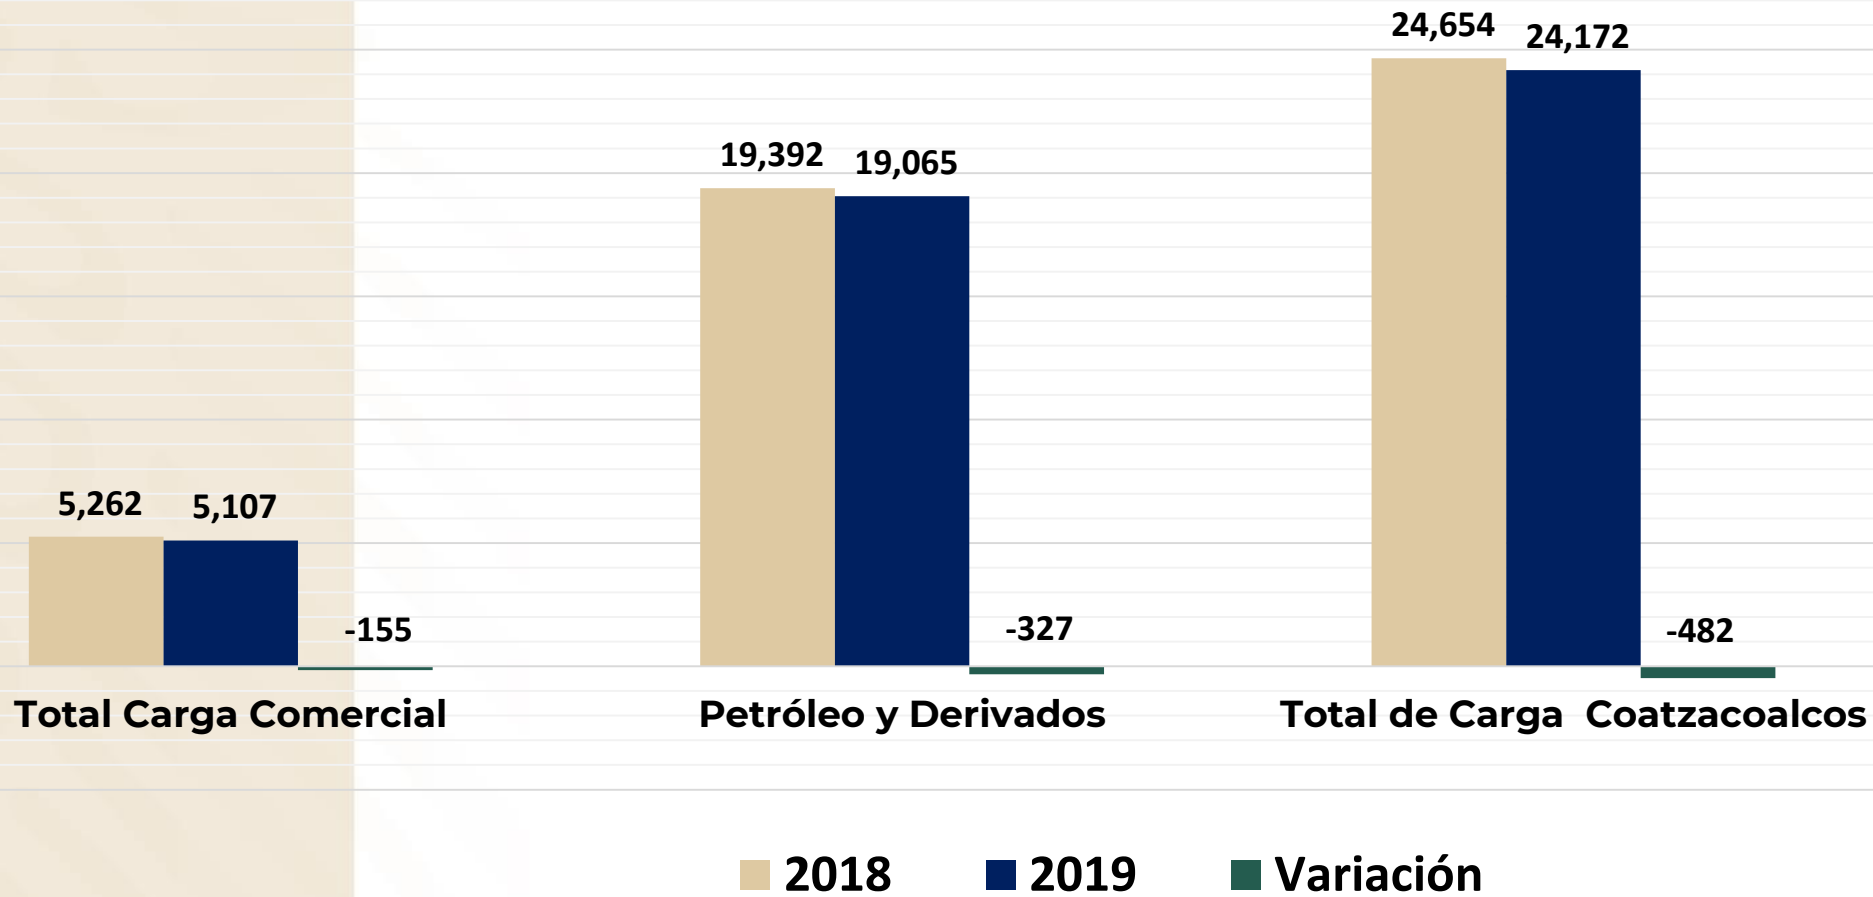

**2018**

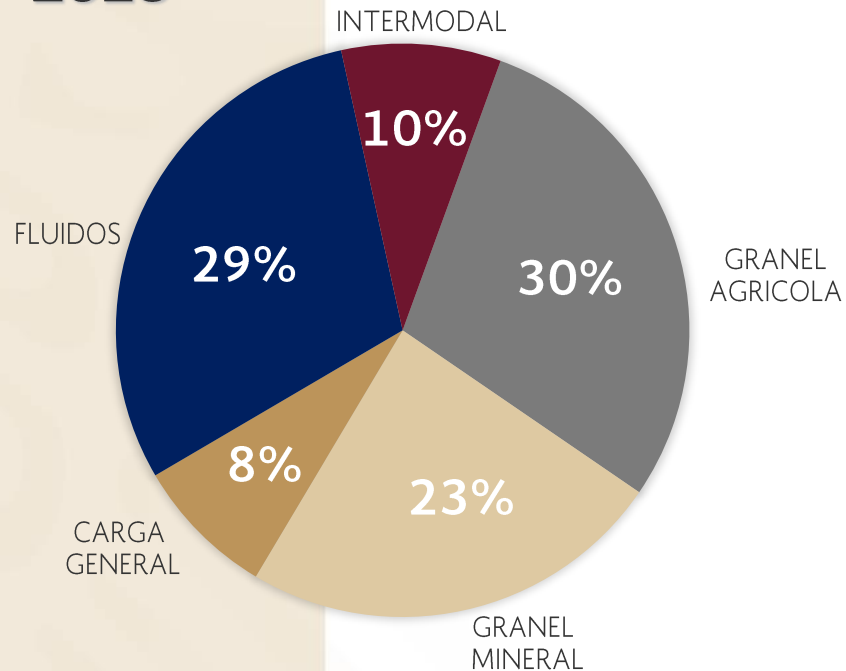

**2019**

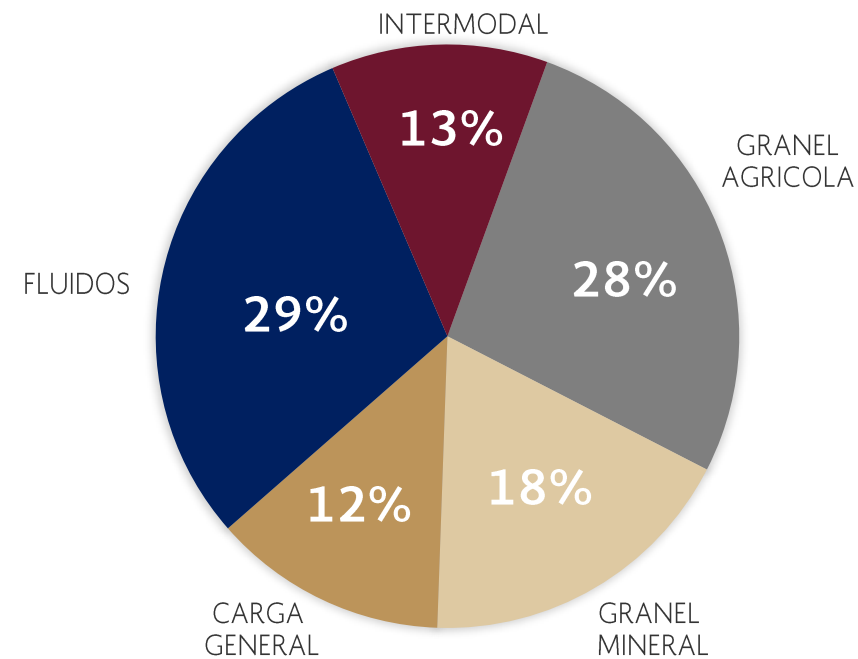

**VARIACIÓN: -2.9%**

## VOLUMEN OPERADO POR TIPODE CARGA

Enero - Octubre  
2018/2019

(Miles de toneladas)

Año	Carga General	Contenerizada	Granel Mineral	Granel Agrícola	Fluídos	Intermodal	TOTAL
2018	305.211	138.378	1,190.368	1,571.318	1,539.420	517.445	5,262.140
2019	521.492	92.390	930.538	1,440.538	1,486.224	635.672	5,107.291


# VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE TRAFICO

Enero - Octubre  
2018/2019


(Miles de toneladas)

Año	Exportación	Importación	Cabotaje	Intermodal	Total
2018	1,038.957	3,389.881	315.857	517.445	5,262.140
2019	1,149.117	3,075.748	246.754	635.672	5,107.291

2018

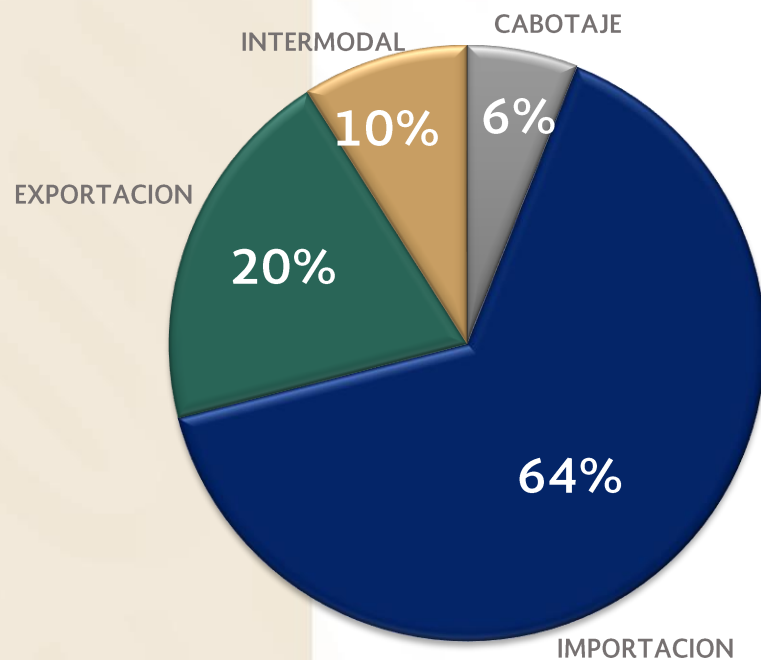


2019

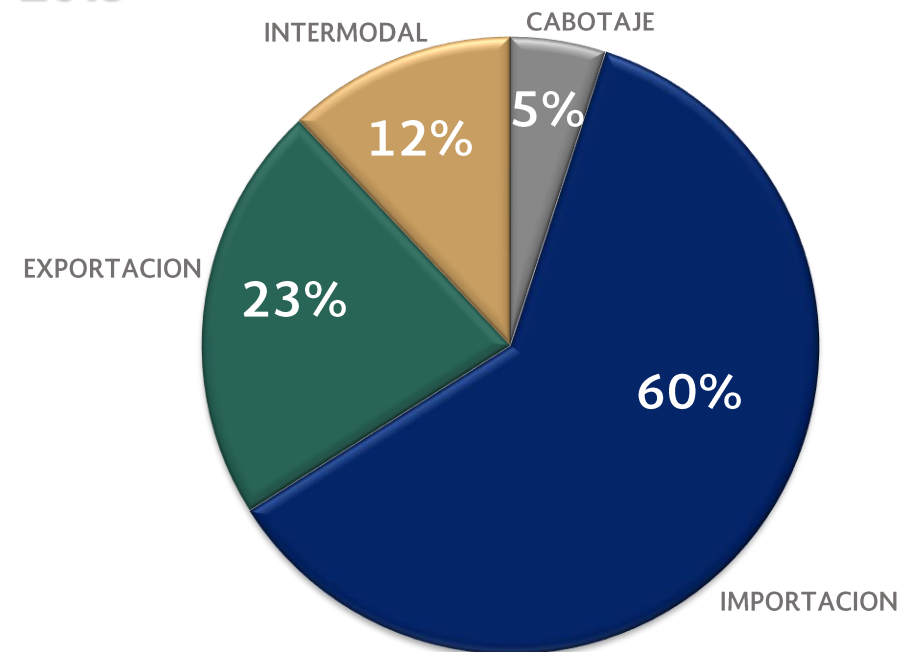

# COMPARATIVO DE EMPRESAS MANIOBRISTAS EN EL MANEJO DE CARGA


Octubre 2019  
(Miles de toneladas)

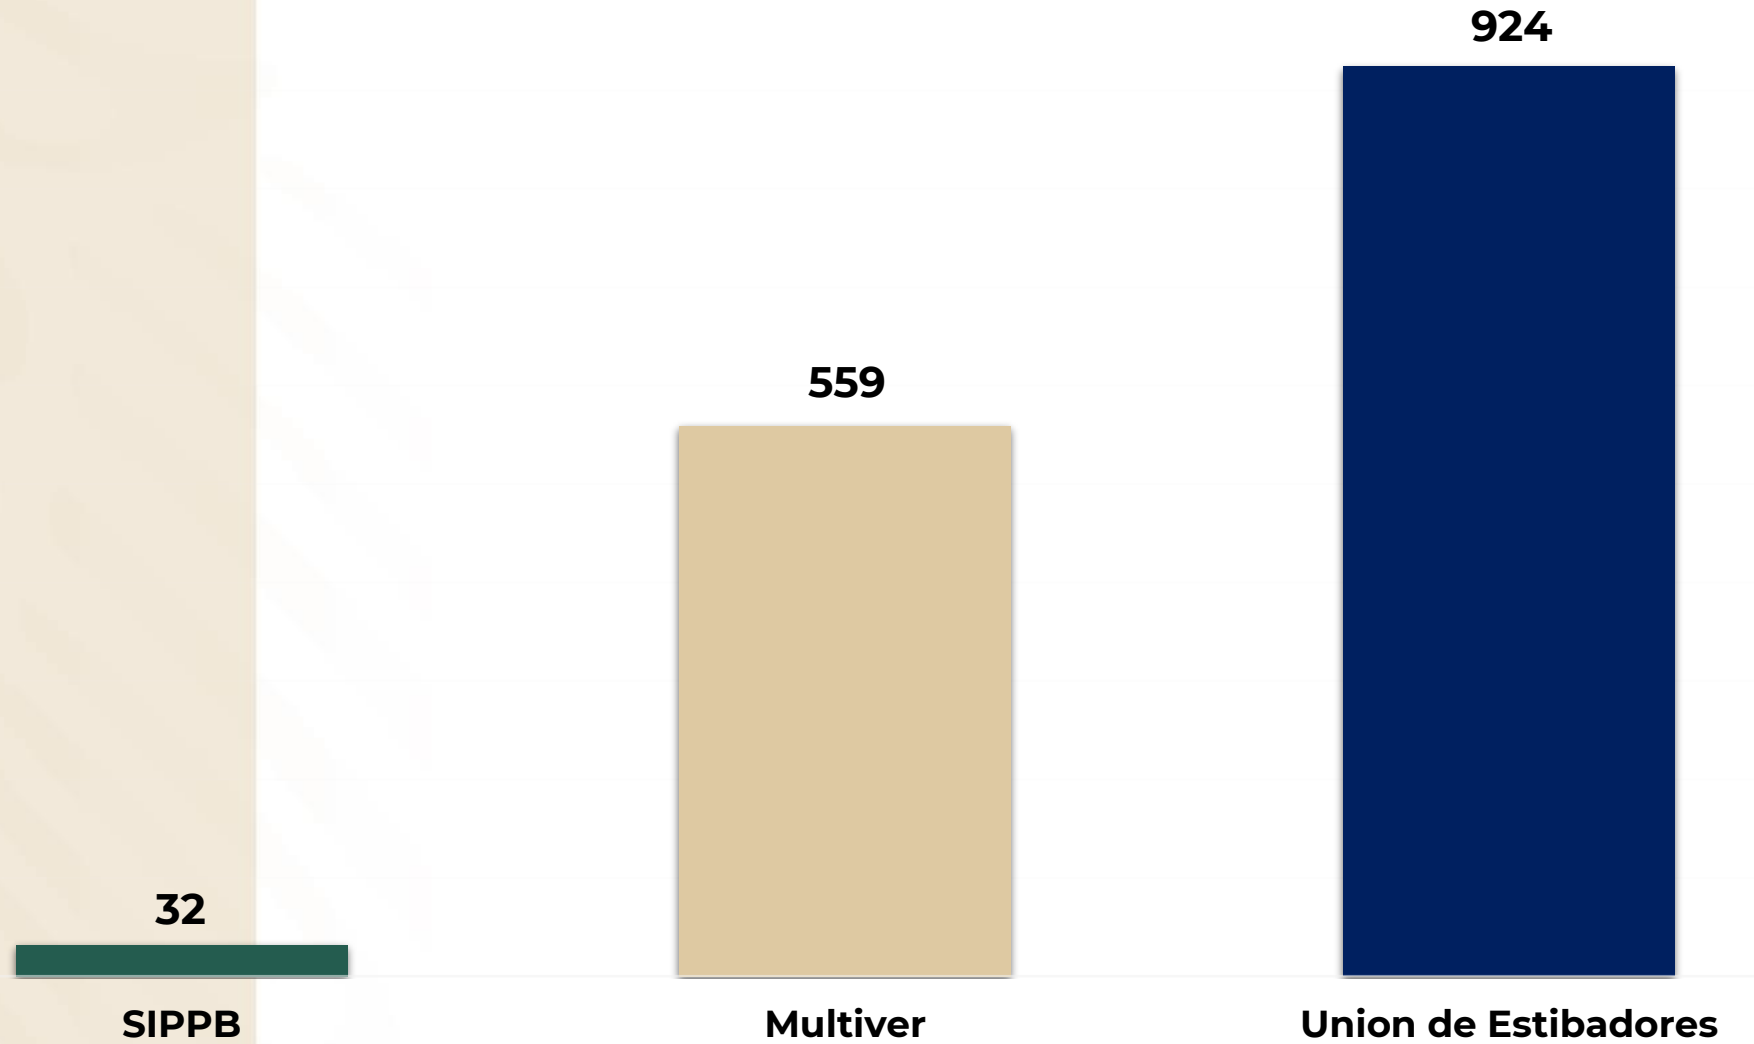




# CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS (THBO)

Octubre  
2018-2019

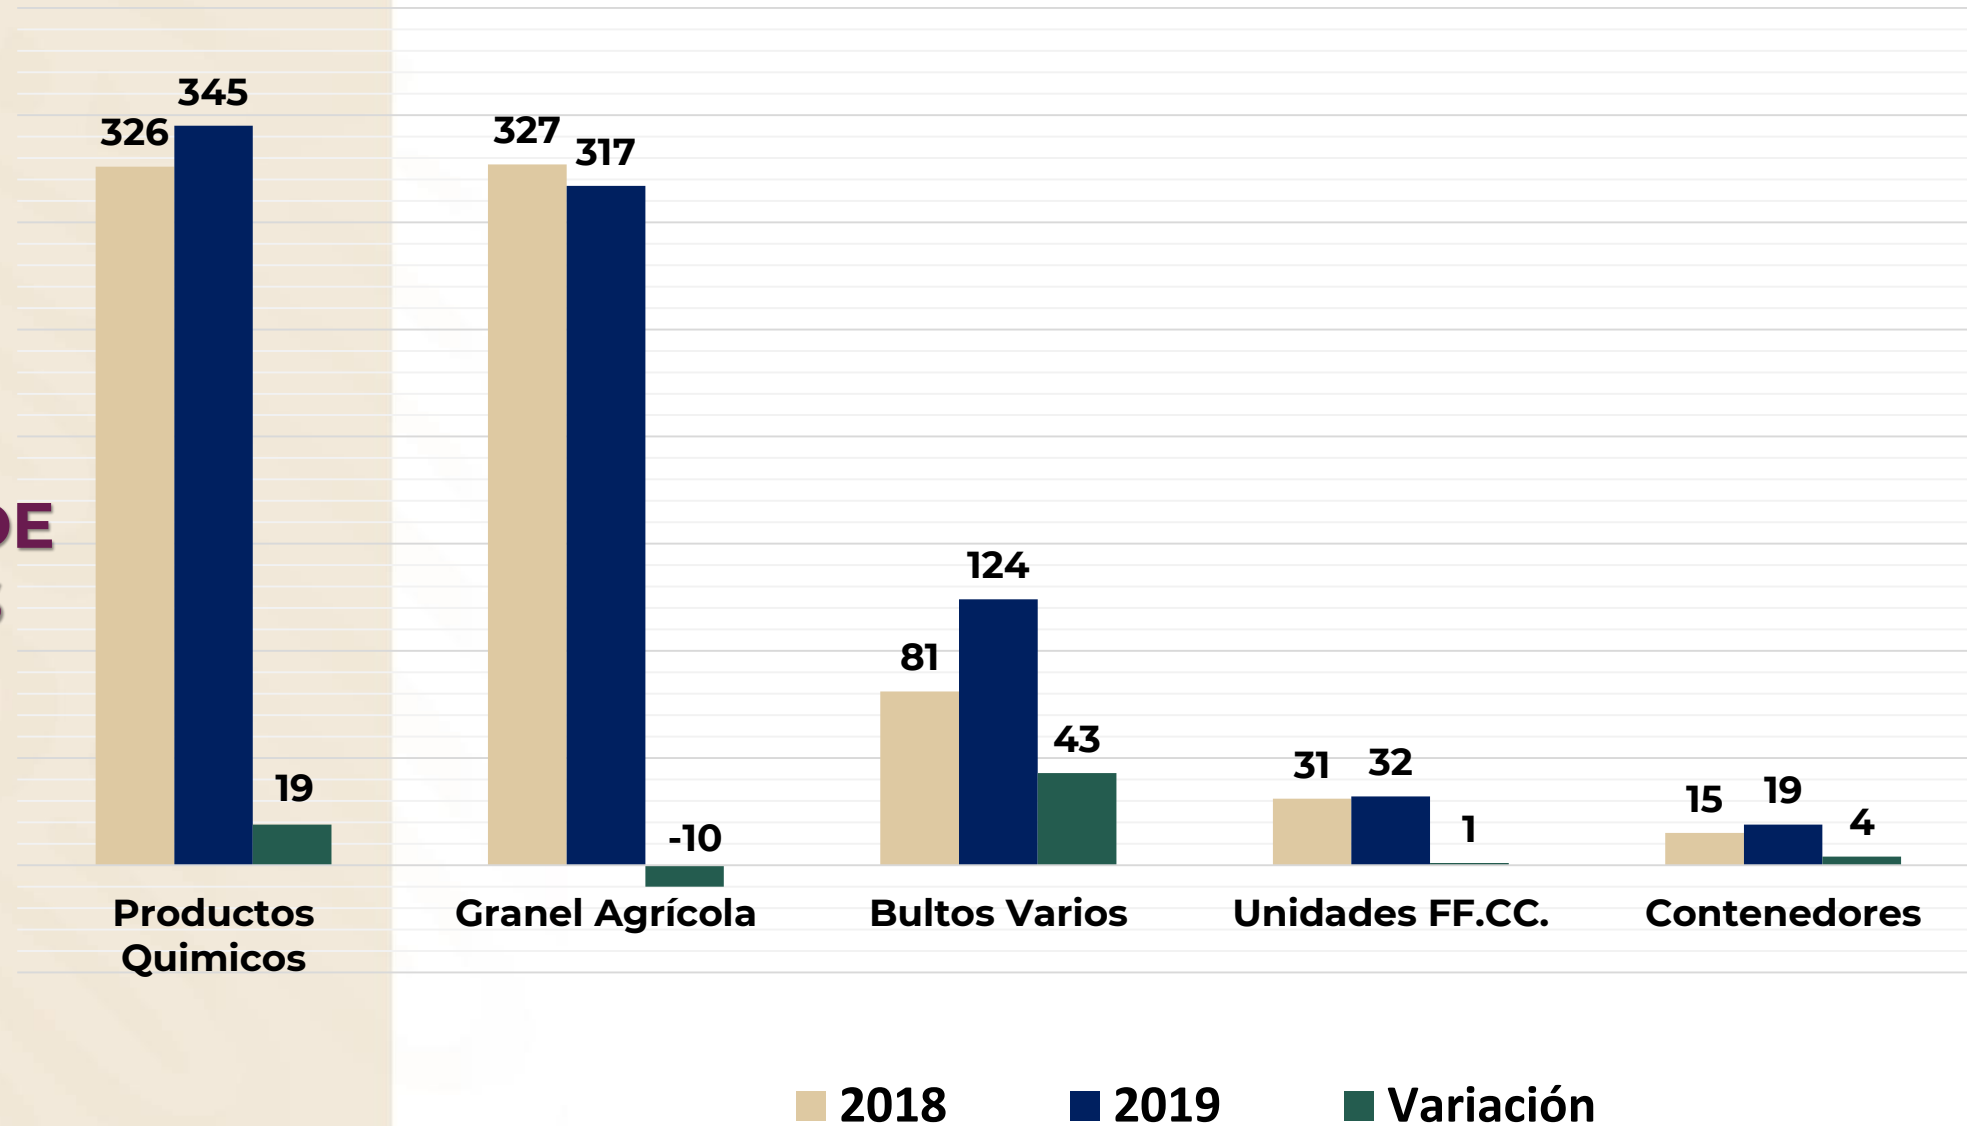

# COMPARATIVO DE OCUPACIÓN DE MUELLES


Enero - Octubre  
2018/2019  
(Porcentaje)

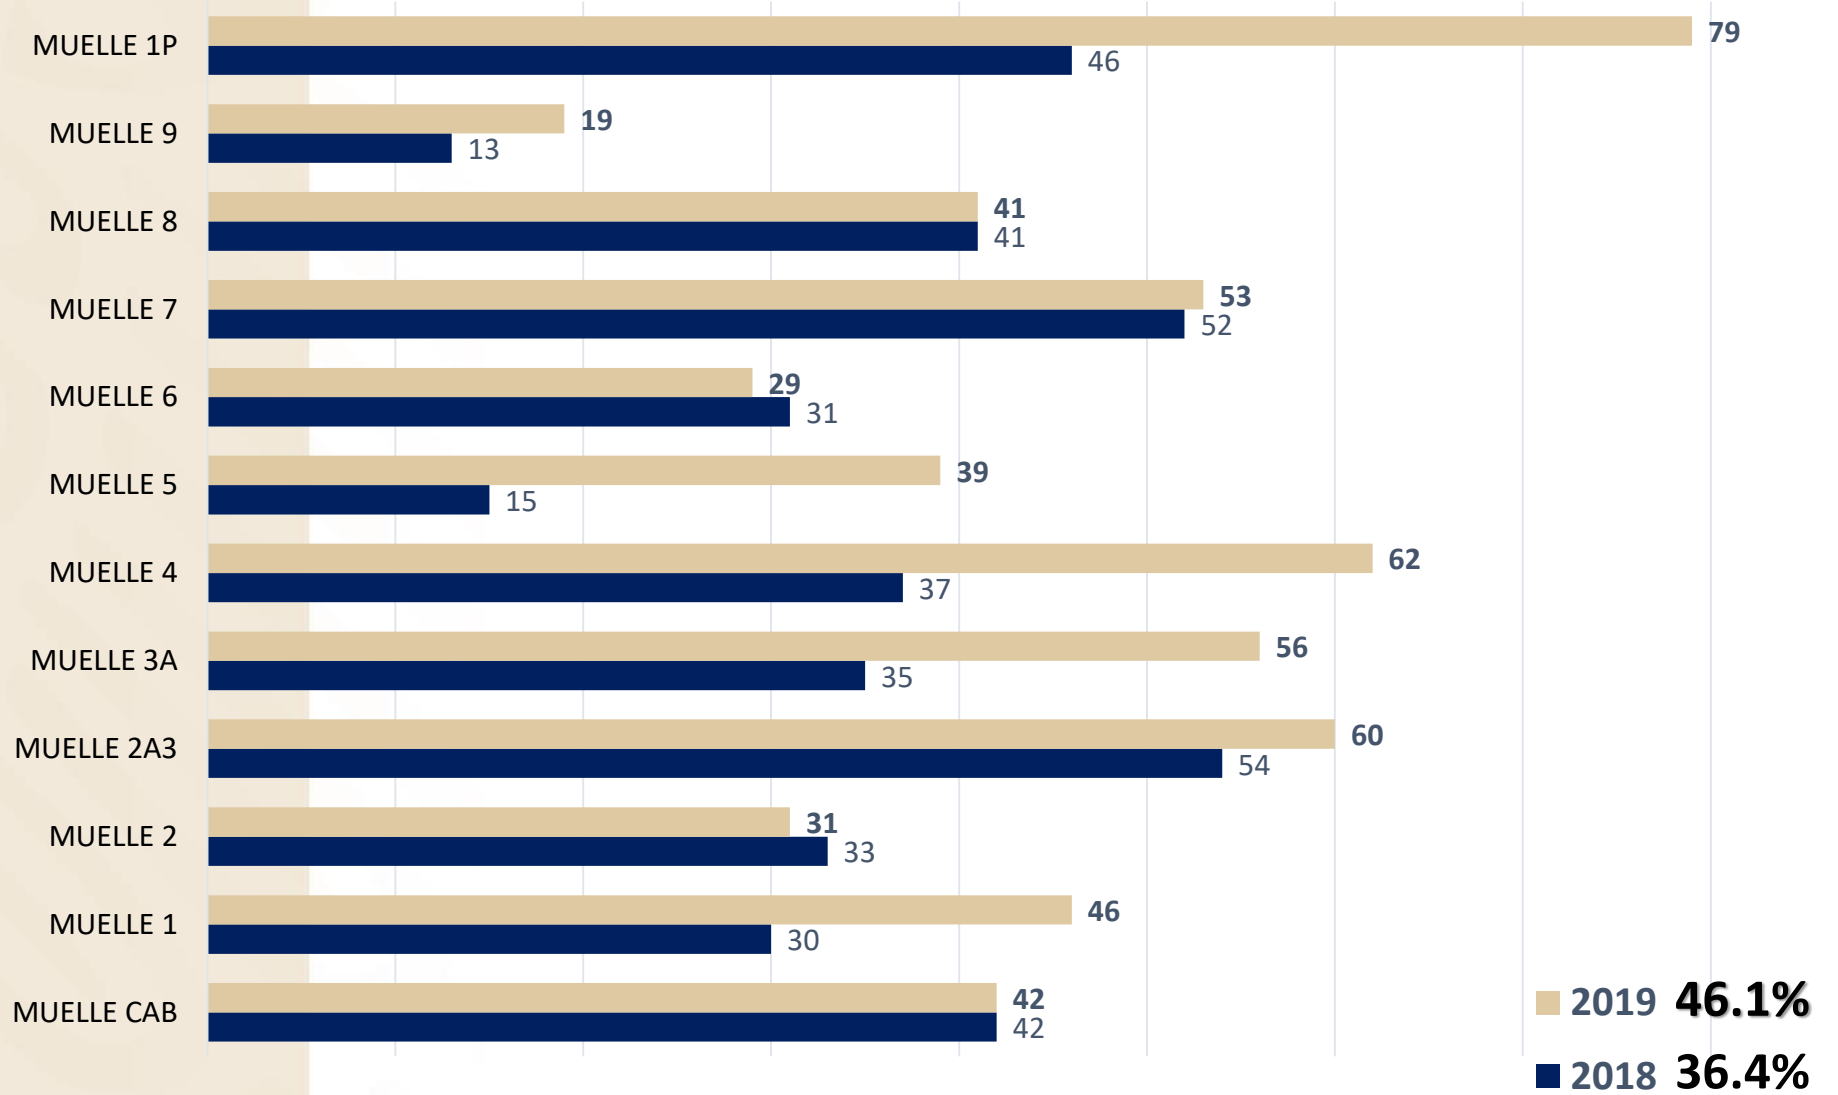

**2018**


**PARTICIPACIÓN  
DEL  
AUTOTRANSPORTE  
Y EL FFCC EN EL  
MOVIMIENTO  
DE LAS CARGAS**

Enero - Octubre  
2018/2019  
(Miles de toneladas)

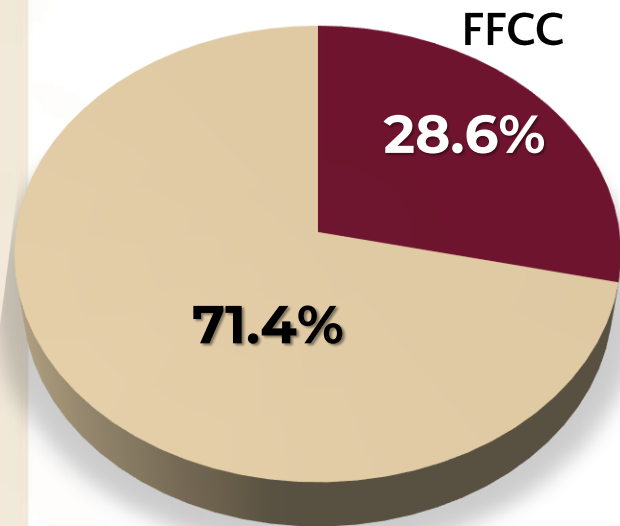

**AUTOTRANSPORTE FEDERAL**

**2019**

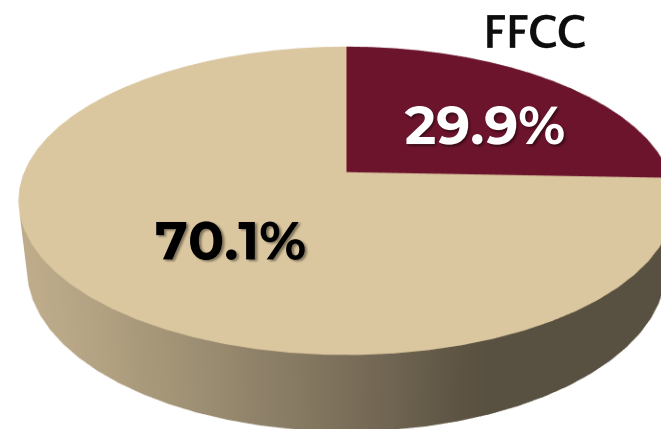


**AUTOTRANSPORTE FEDERAL**

	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	HR / BARCO
Promedios	4,885	4,692	12

## COMPARATIVO


FERROBUQUES OCTUBRE 2019  
(Miles de toneladas)

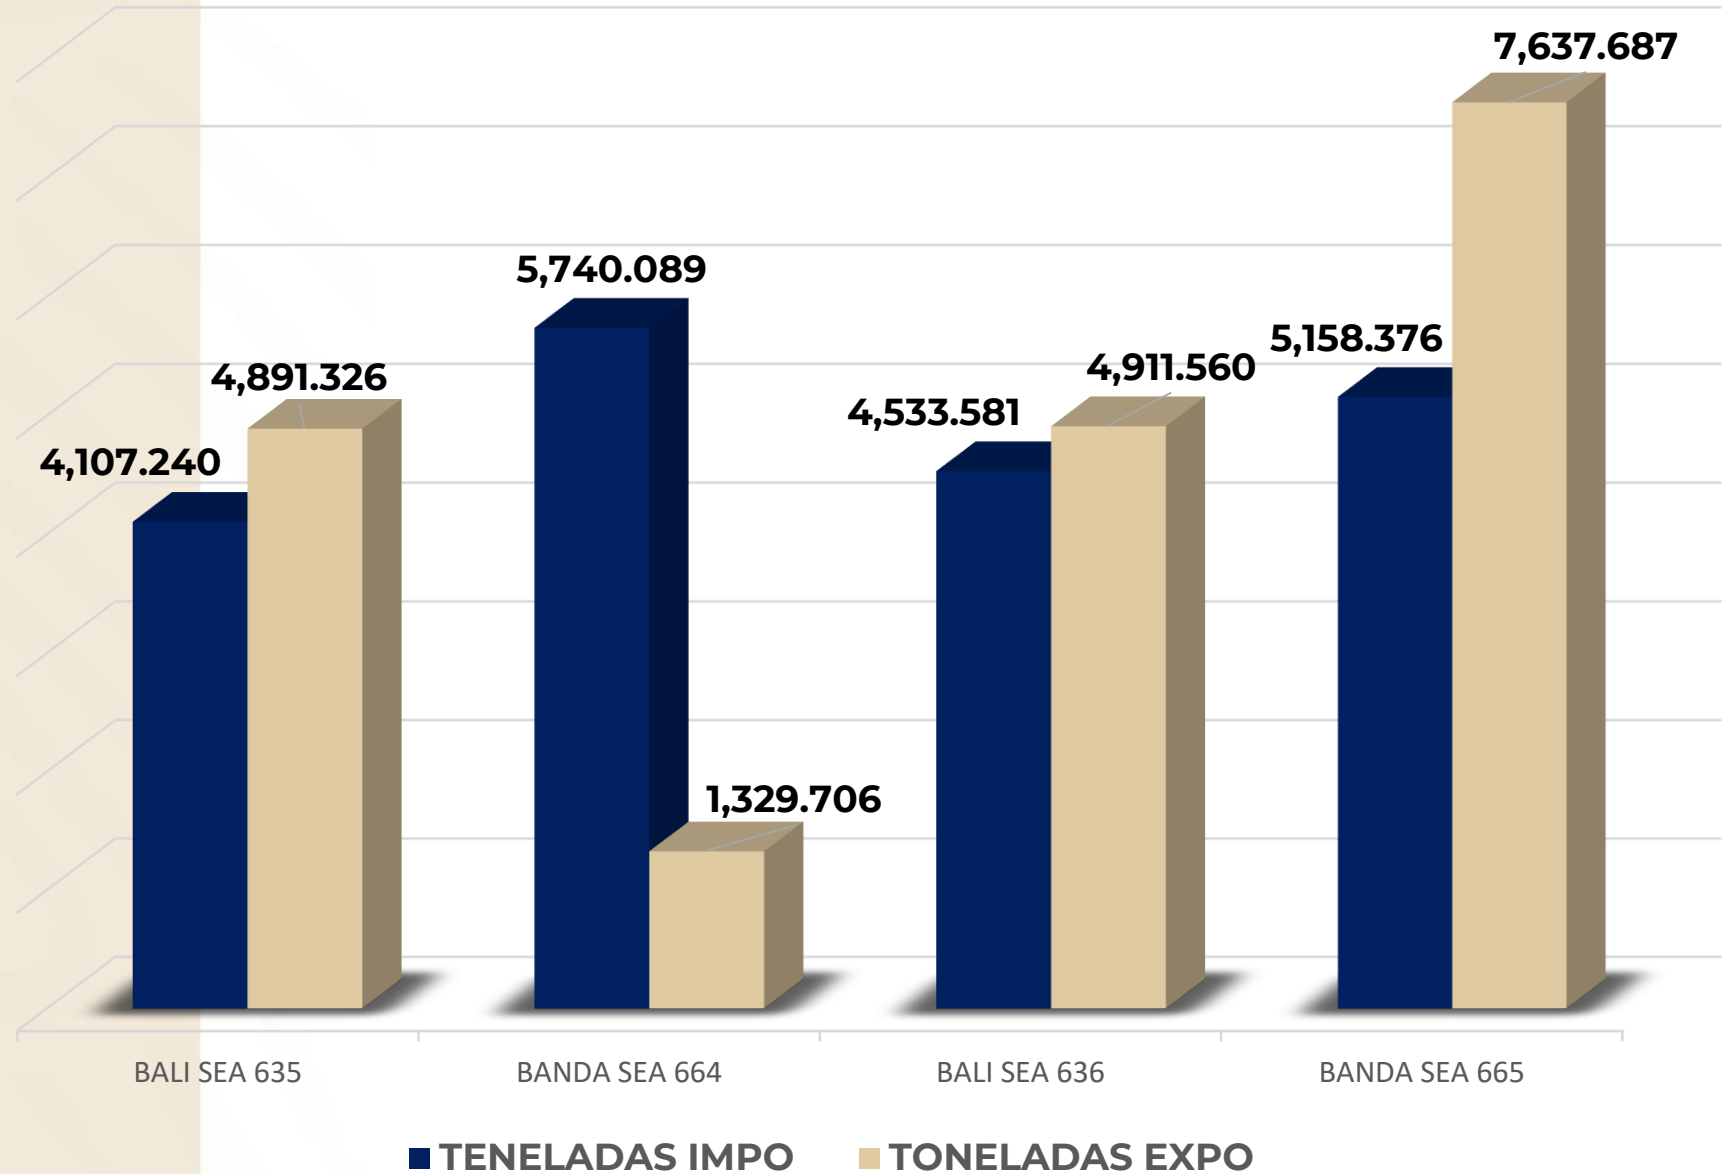

## COMPARATIVO

IMPO VS EXPO OCTUBRE 2019  
(Toneladas netas de mercancía)

**Total:**  
38,311.6

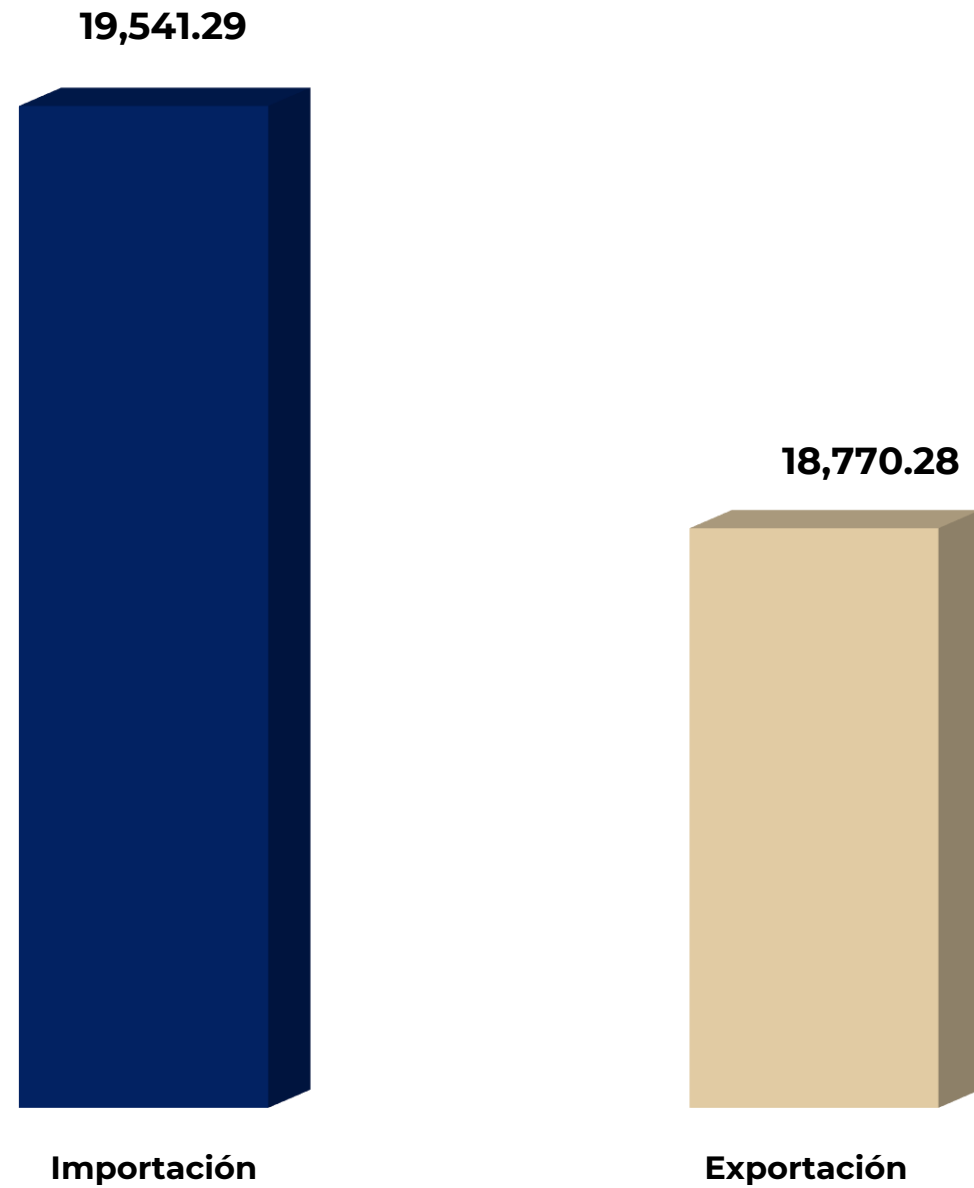


## COMPARATIVO

SEPTIEMBRE VS OCTUBRE 2019  
(Toneladas netas de mercancía)

4,904  
Importación ↓


2,092  
Exportación ↑

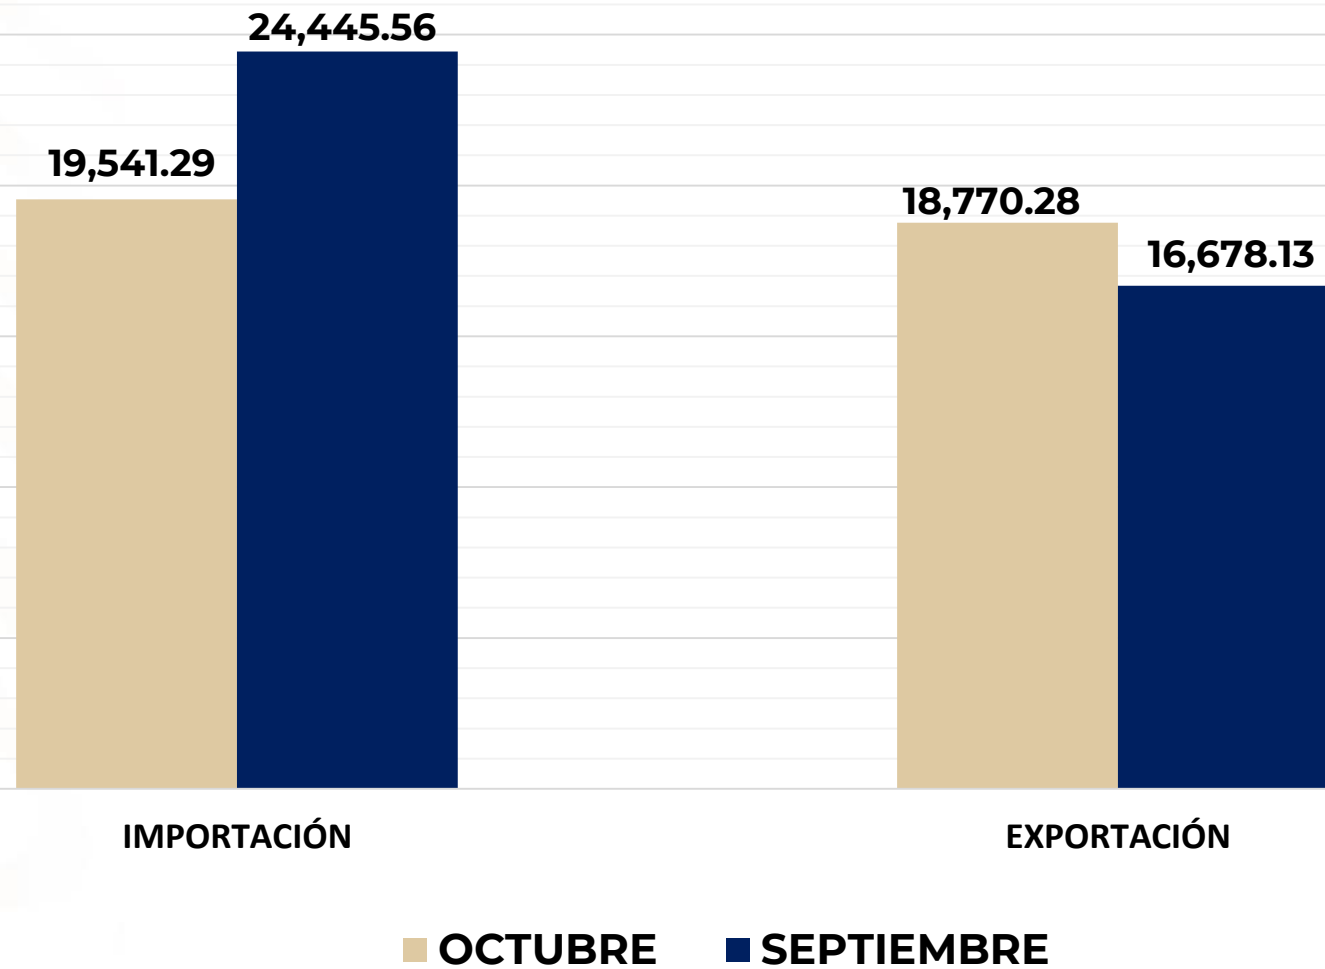

Importación		Exportación		Carros
Cargados	Vacíos	Cargados	Vacíos	
261	143	224	210	838

## UNIDADES CARGADAS Y VACIAS

OCTUBRE 2019  
(Miles de toneladas)

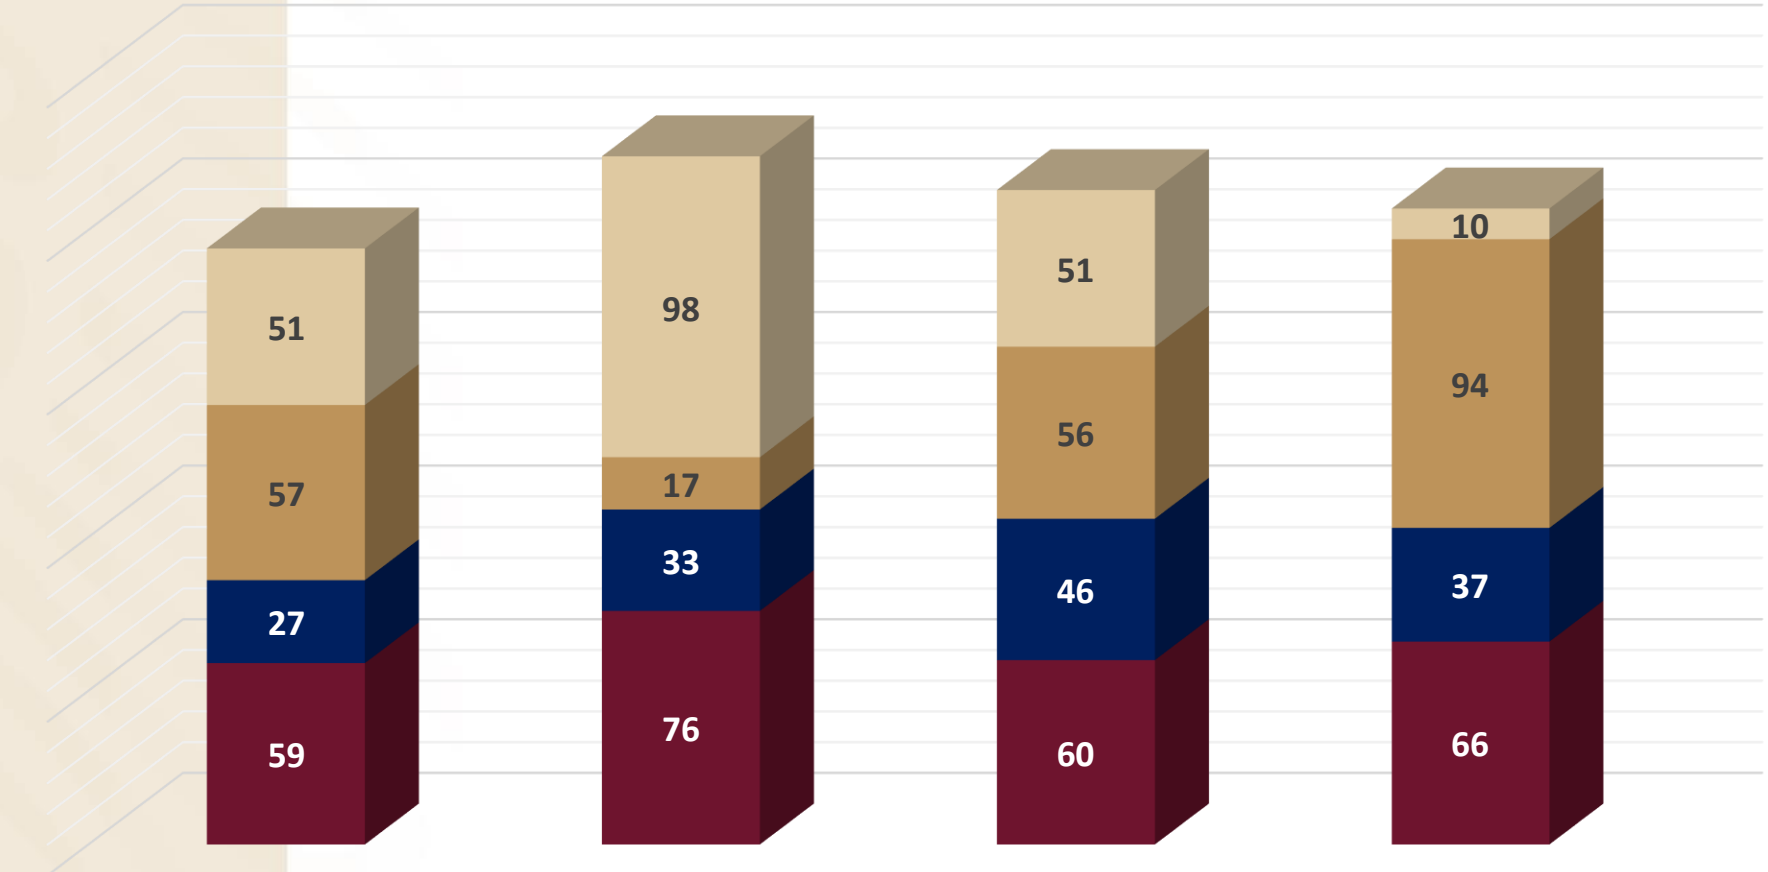

BALI SEA 635

BANDA SEA 664

BALI SEA 636

BANDA SEA 665

■ UNIDADES IMPO CARGADAS

■ UNIDADES IMPO VACIAS


■ UNIDADES EXPO CARGADAS

■ UNIDADES EXPO VACIAS

**COMPARATIVO**  
OCTUBRE 2018-2019  
(Toneladas netas de mercancía)

**6,849**  
Importación ↓

**6,296**  
Exportación ↑

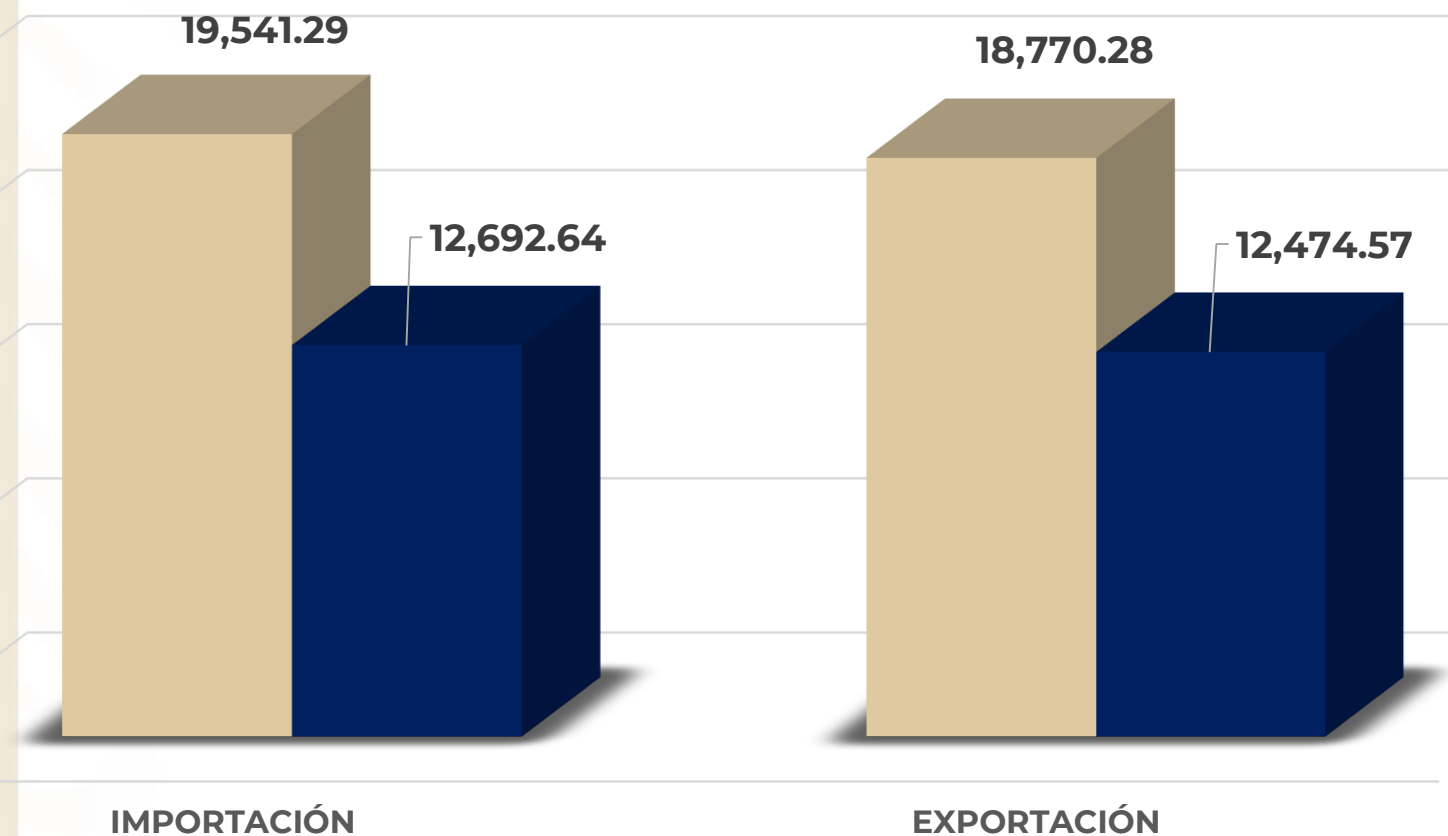

■ OCTUBRE 2019 ■ OCTUBRE 2018



**MANTENIMIENTOS ANUALES:  
ÁREAS VERDES, HIDRÁULICO,  
ELÉCTRICO Y VÍAS FERRÉAS EN  
LOS RECINTOS PORTUARIOS DE  
COATZACOALCOS Y PAJARITOS,  
Y EN EL FARO LUCIO GALLARDO  
Y PAVÓN, UBICADO EN VILLA  
ALLENDE**

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Octubre 2019**



ÁREAS VERDES



ÁREAS VERDES



HIDRÁULICO


<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-04 19-API-GI-OP-05 19-API-GI-OP-12 19-API-GI-OP-16</b>
Monto Contratado	17.36 MDP
Avance Físico	9.20 MDP, 53%
Avance Financiero	10.41 MDP, 60%
Importe por Erogar	6.95 MDP, 40%

# MANTENIMIENTOS ANUALES

Reporte Octubre 2019



ELÉCTRICO

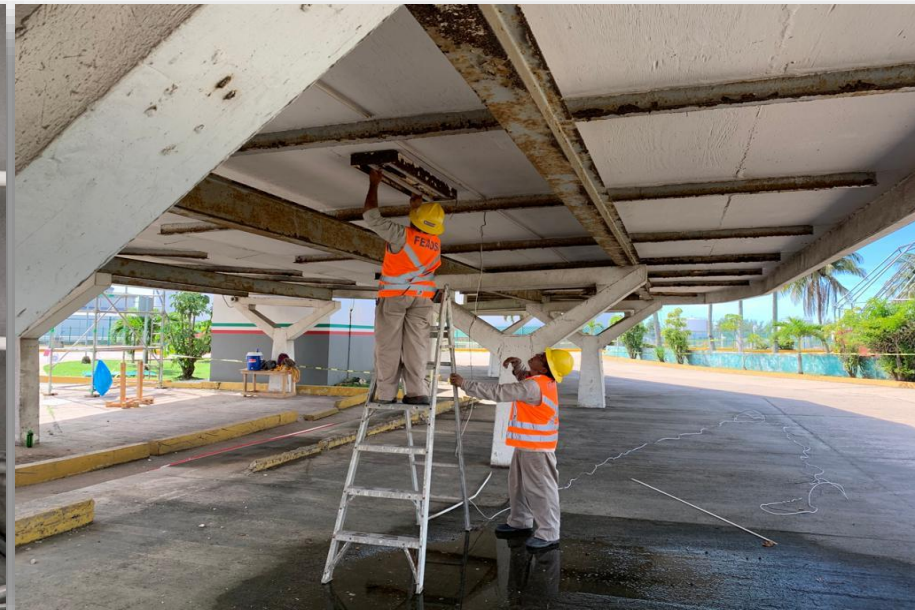

ELÉCTRICO



VÍAS FÉRREAS



VÍAS FÉRREAS

# REHABILITACIÓN DE LOSAS FRENTE A BODEGAS 3 Y 4, Y AVENIDA QUETZALCÓATL ENTRE TLALOC Y TOLTECA EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Octubre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-11 19-API-GI-OP-22</b>
Monto Contratado	13.45 MDP
Avance Físico	10.08 MDP, 75%
Avance Financiero	10.83 MDP, 80%
Importe por Erogar	2.62 MDP, 20%

# MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE CONCERTINA, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Octubre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-15</b>
Monto Contratado	5.26 MDP
Avance Físico	2.68 MDP, 51%
Avance Financiero	4.57 MDP, 86%
Importe por Erogar	0.69 MDP, 14%

# MANTENIMIENTO MEDIANTE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIALIDADES Y PINTURA A INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO DE COATZACOALCOS, PAJARITOS Y FARO LUCIO GALLARDO

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

Reporte Octubre 2019



Contrato	19-API-GI-OP-17
Monto Contratado	4.24 MDP
Avance Físico	3.81 MDP, 90%
Avance Financiero	1.53 MDP, 36%
Importe por Erogar	2.71 MDP, 64%

# MANTENIMIENTO BODEGAS DE ALMACENAMIENTO NO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y "C" EN EL RECINTO PORTUARIO DE COATZACOALCOS: Y 1, 2, 3 Y 4 EN PAJARITOS.

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Octubre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-20 19-API-GI-OP-24</b>
Monto Contratado	11.00 MDP
Avance Físico	8.80 MDP, 80%
Avance Financiero	7.67 MDP, 70%
Importe por Erogar	3.33 MDP, 30%

**OBRA ELÉCTRICA: PARARRAYOS,  
ALIMENTADORES, PROTECCIÓN  
ATMOSFÉRICA PARA BODEGAS;  
BANCOS DE CAPACITORES PARA  
SUBESTACIÓN PRINCIPAL;  
PLANTA DE EMERGENCIA EN LA  
TORRE DE CONTROL; EN EL  
RECINTO PORTUARIO  
COATZACOALCOS**

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Octubre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-25</b>
Monto Contratado	12.03 MDP
Avance Físico	6.01 MDP, 50%
Avance Financiero	1.51 MDP, 13%
Importe por Erogar	10.52 MDP, 87%

# MANTENIMIENTO A LA OBRA DE PROTECCIÓN DEL CUERPO Y MORRO DE LA ESCOLLERA LADO OESTE, EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Octubre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-31</b>
Monto Contratado	22.50 MDP
Avance Físico	6.75 MDP, 30%
Avance Financiero Anticipo	3.73 MDP, 17%
Importe por Erogar	18.77 MDP, 83%



# REHABILITACIÓN DE CISTERNA, TANQUE ELEVADO, MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO AL SISTEMA DE BOMBEO DE API PAJARITOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

Reporte Octubre 2019



Contrato	19-API-GI-OP-33
Monto Contratado	2.30 MDP
Avance Físico	1.15 MDP, 50%
Avance Financiero	0.91 MDP, 40%
Importe por Erogar	1.39 MDP, 60%

**TRABAJOS DE PINTURA EN  
EDIFICIO PRINCIPAL, OIC,  
ESTACIÓN DE BOMBEROS,  
MÓDULO DE  
DOCUMENTACIÓN, TALLERES Y  
ALMACENES, EN EL RECINTO  
PORTUARIO COATZACOALCOS**

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Octubre 2019**




<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-34</b>
Monto Contratado	4.96 MDP
Avance Físico	2.08 MDP, 42%
Avance Financiero	1.90 MDP, 38%
Importe por Erogar	3.06 MDP, 62%

# REHABILITACIÓN DE VÍAS FÉRREAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

Reporte Octubre 2019

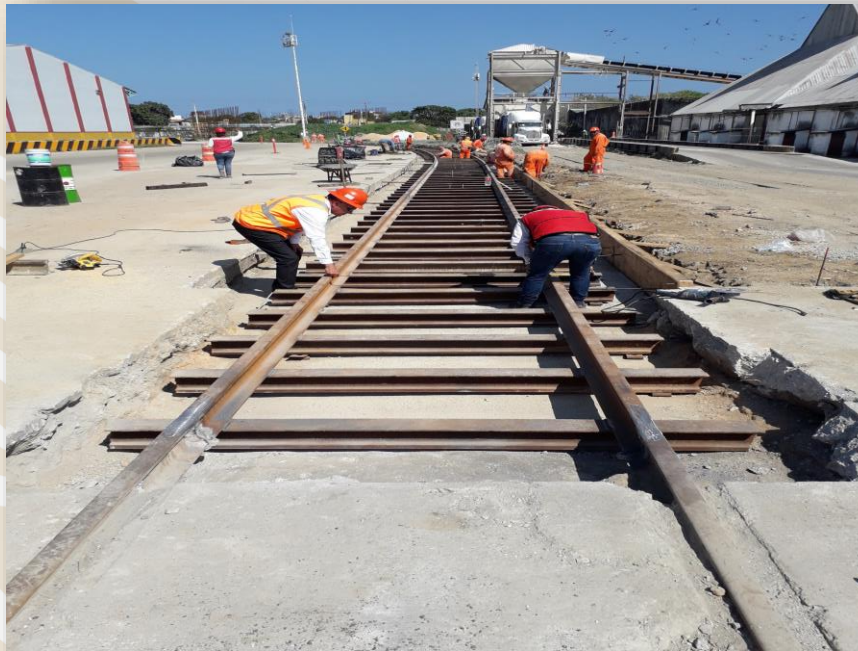

Contrato	19-API-GI-OP-35
Monto Contratado	12.96 MDP
Avance Físico	8.29 MDP, 64%
Avance Financiero	6.25 MDP, 48%
Importe por Erogar	6.71 MDP, 52%

# REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO. 2 Y BARDA PERIMETRAL EN MUELLE DE CABOTAJE POR DAÑOS OCASIONADOS DE LOS SISMOS DEL AÑO 2017, EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capítulo 3000

Reporte Octubre 2019



BARDA PERIMETRAL CABOTAJE



TORRE DE CONTROL




TECHUMBRES

<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-36</b>
Monto Contratado	10.64 MDP
Avance Físico	2.12 MDP, 20%
Avance Financiero	1.53 MDP, 14%
Importe por Erogar	9.11 MDP, 86%

# INGRESOS

## Enero – Octubre 2019

( Miles de pesos)

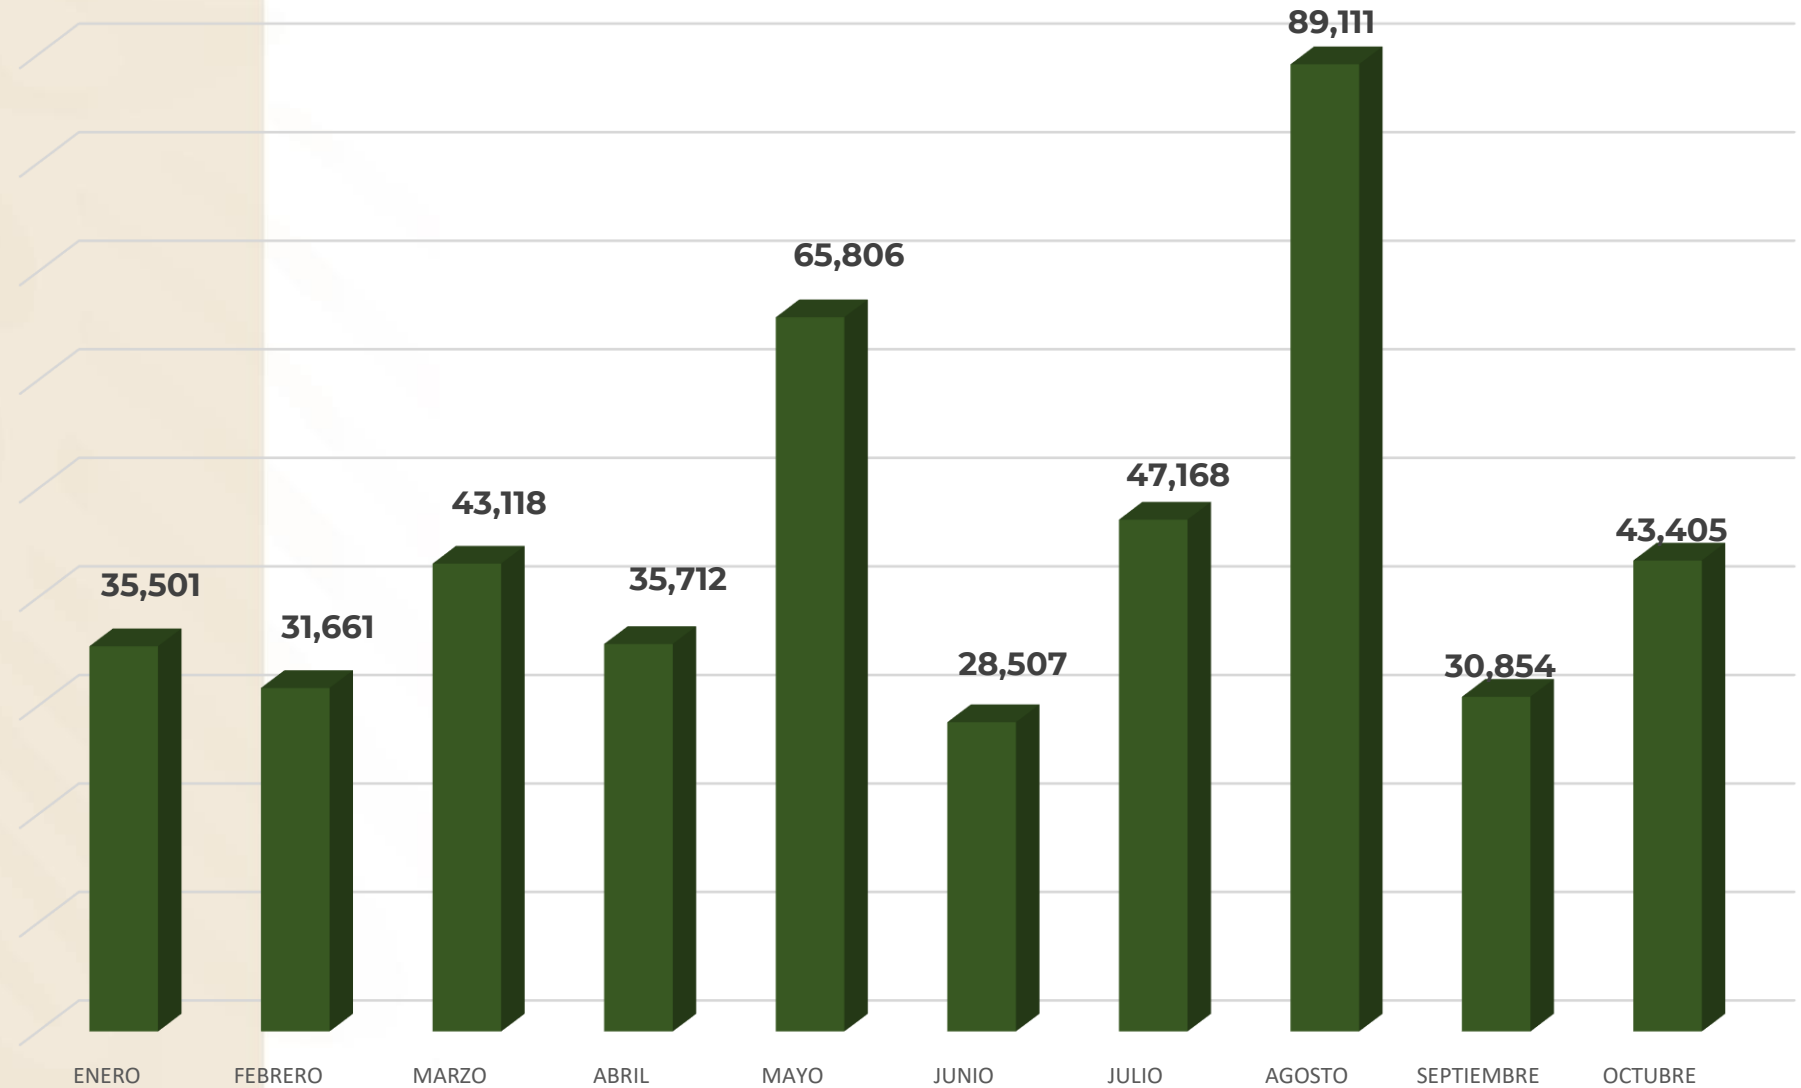


# CAPÍTULOS

## Enero – Octubre


### 2019

( Miles de pesos)

#### SERVICIOS PERSONALES (1000)

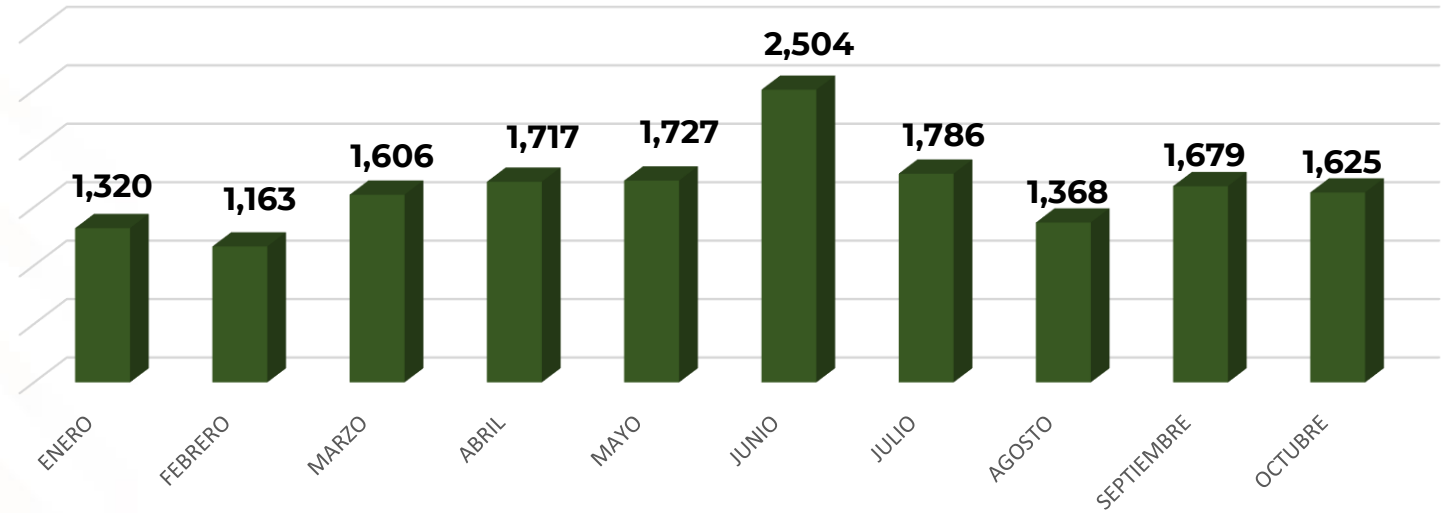


#### MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)

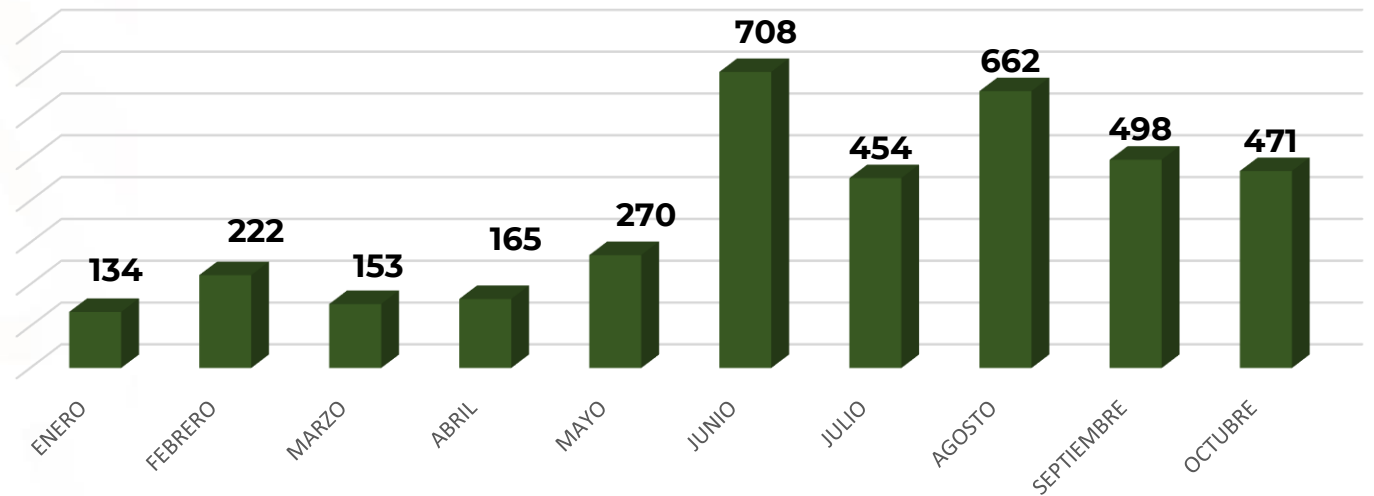


# CAPÍTULOS Enero – Octubre 2019

( Miles de pesos)

## SERVICIOS GENERALES (3000)

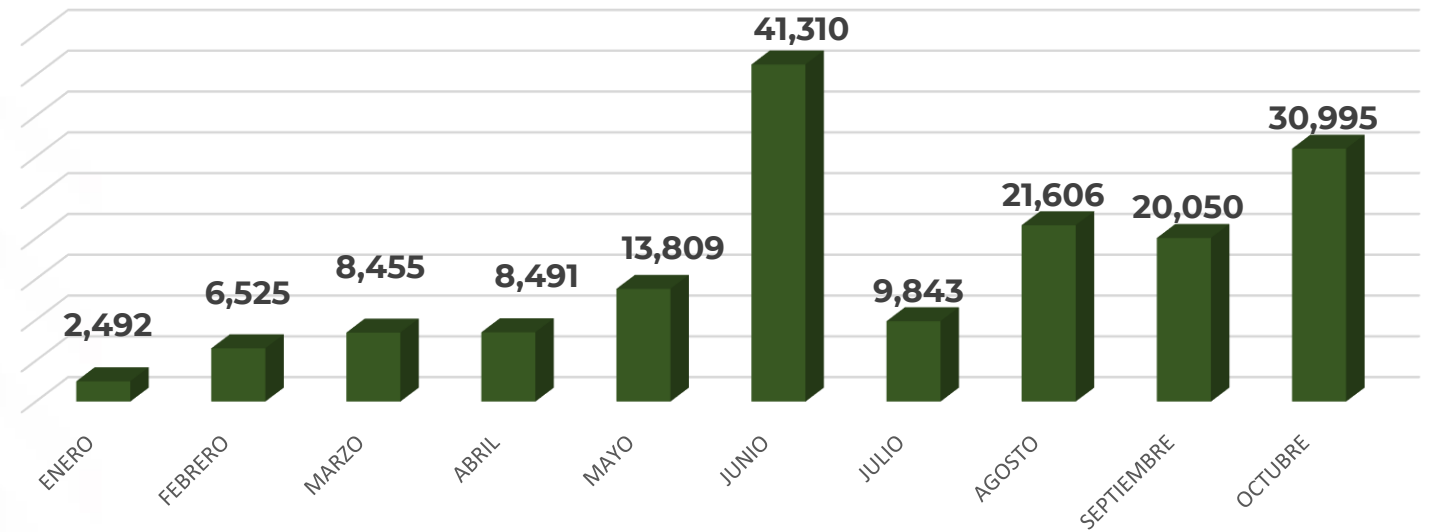


## OBRA PUBLICA (6000)

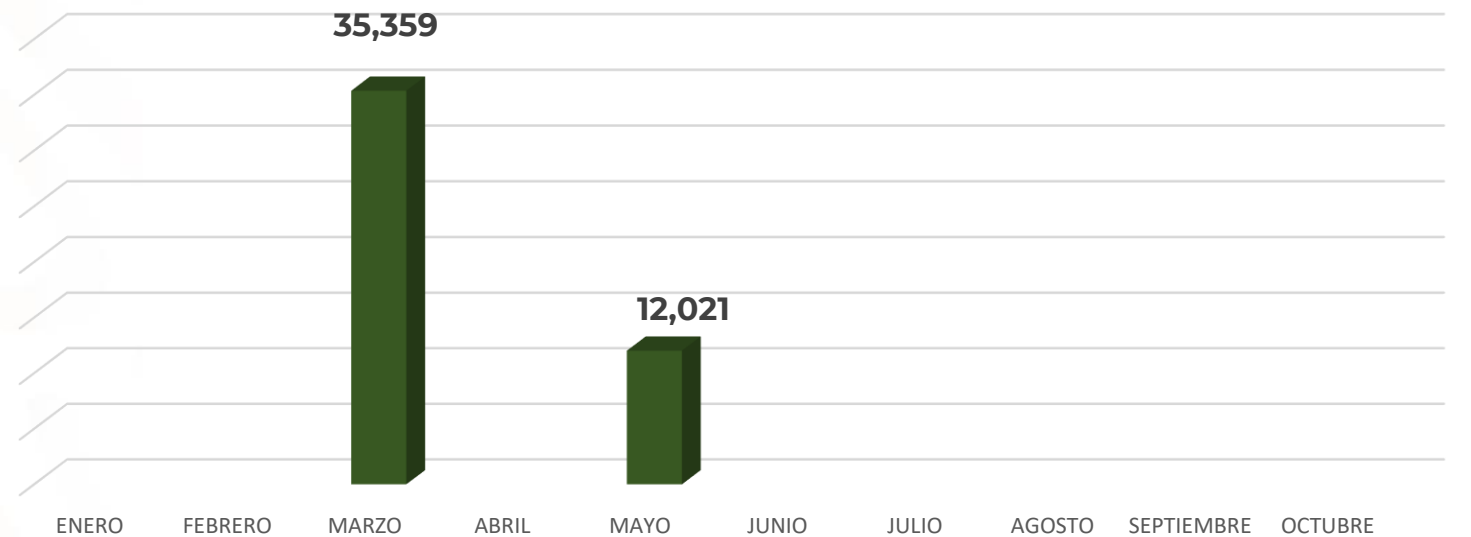

# CAPÍTULOS Enero – Octubre 2019

( Miles de pesos)

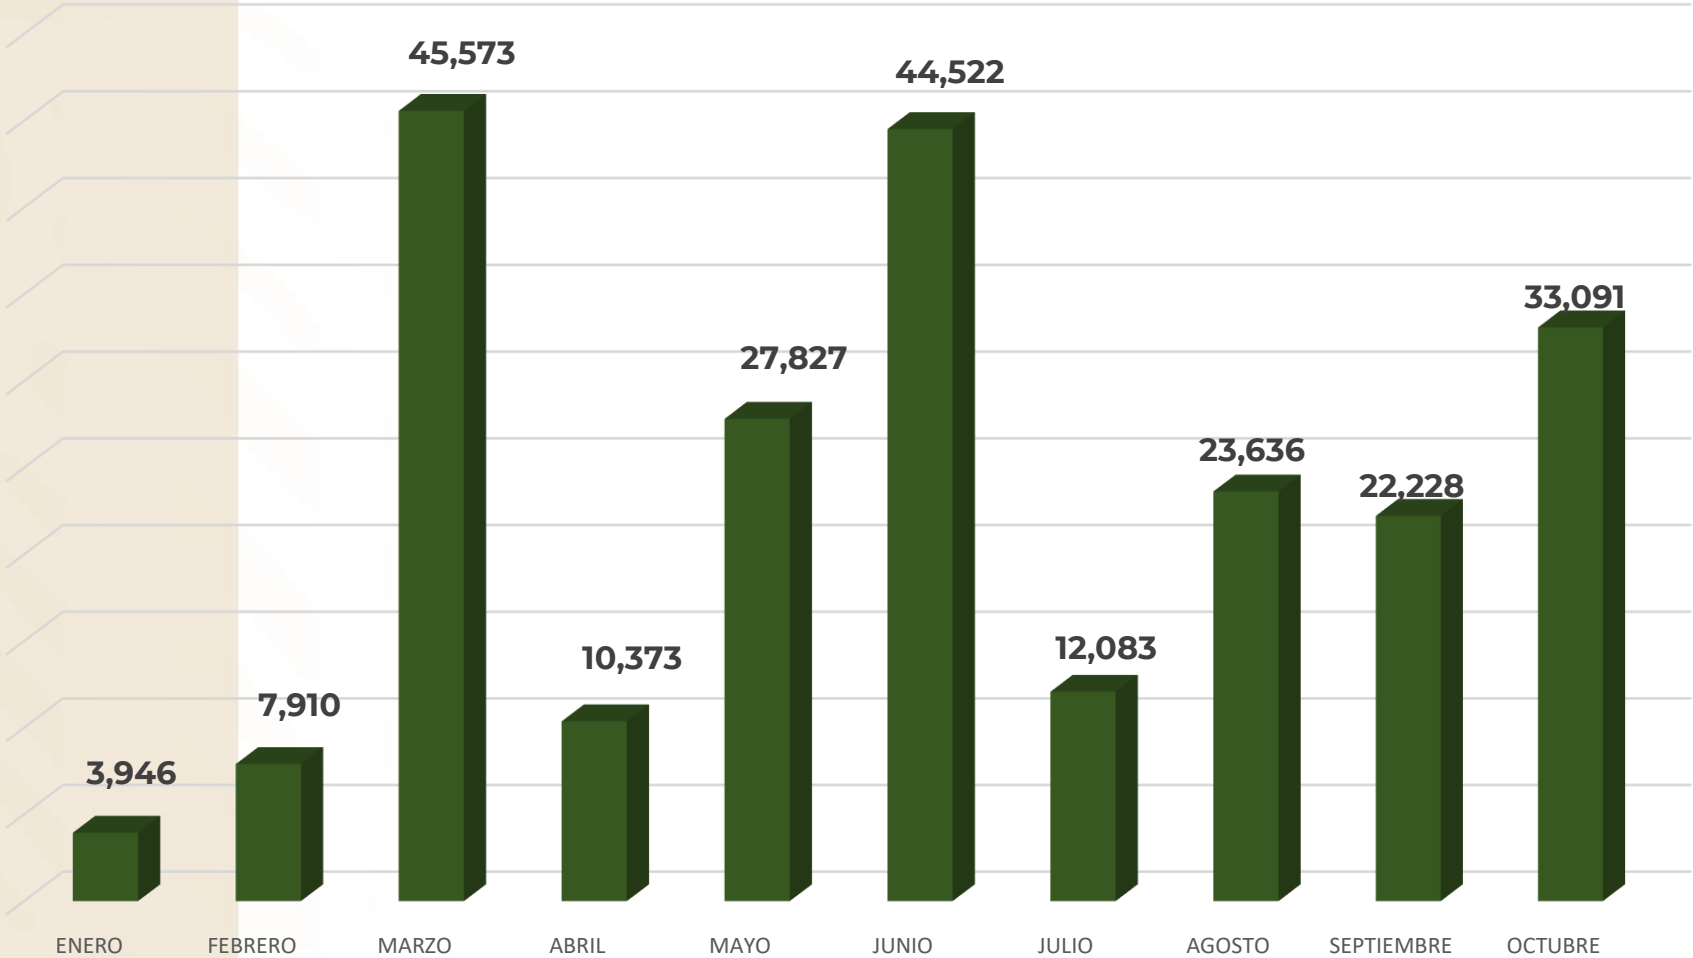





## Integración de la Comunidad Portuaria 07 de noviembre de 2019

### **Asuntos tratados:**

- Presentación del proyecto de la comunidad portuaria.
- Propuesta de diseño del logotipo.
- Presentación del Reglamento Interior.
- Propuesta de celebración de sesiones.



### **Asistentes:**

- API Coatzacoalcos.
- Presidente Municipal de Coatzacoalcos.
- SEDECOP.
- Administrador de la Aduana.
- SEMAR.
- SEMARNAT.
- INAMI.
- FERROSUR.
- Representante de Cesionarios
- Representante de prestadores de servicios
- Capitanía de Puerto.
- Representante de las Agencias Navieras.

## Visita de Expertos de Singapur a Coatzacoalcos y Personal del CIIT

20 y 21 de noviembre

Reuniones con diversas autoridades y organismos:

**Autoridades estatales:** SEDECOP, CEIEG.

**Presidentes Municipales** de la Región Sur.

**Cámaras y Asociaciones** del estado de Veracruz: AIEVAC, CMIC, CANACINTRA, CANACO SERVITUR, CCE, COPARMEX, CONCAMIN, COMCE, AAAVER y la ATEPVER.

**Academia:** UV, UTS, ITESCO y la SEP.



16 octubre – 15 noviembre

- Celebración del Día de Muertos (22 oct – 03 nov)
  - Visitas guiadas
  - Taller de máscaras: mapache, hocofaisán, mono araña y calaveritas
- Concurso y taller de catrinas
- Taller de flores e papel y papel picado
- Altar de muertos estilo Tabasco



Llegamos a 50,000 visitantes!!




# Síguenos...



@coatzaport

12,5 miles  
seguidores



Puerto Coatzacoalcos  
@puerto.coatzacoalcos

112,199  
seguidores


@Parquedelbicentenariocoatzacoalcos

4,261  
seguidores



puertocoatzacoalcos

104  
suscriptores

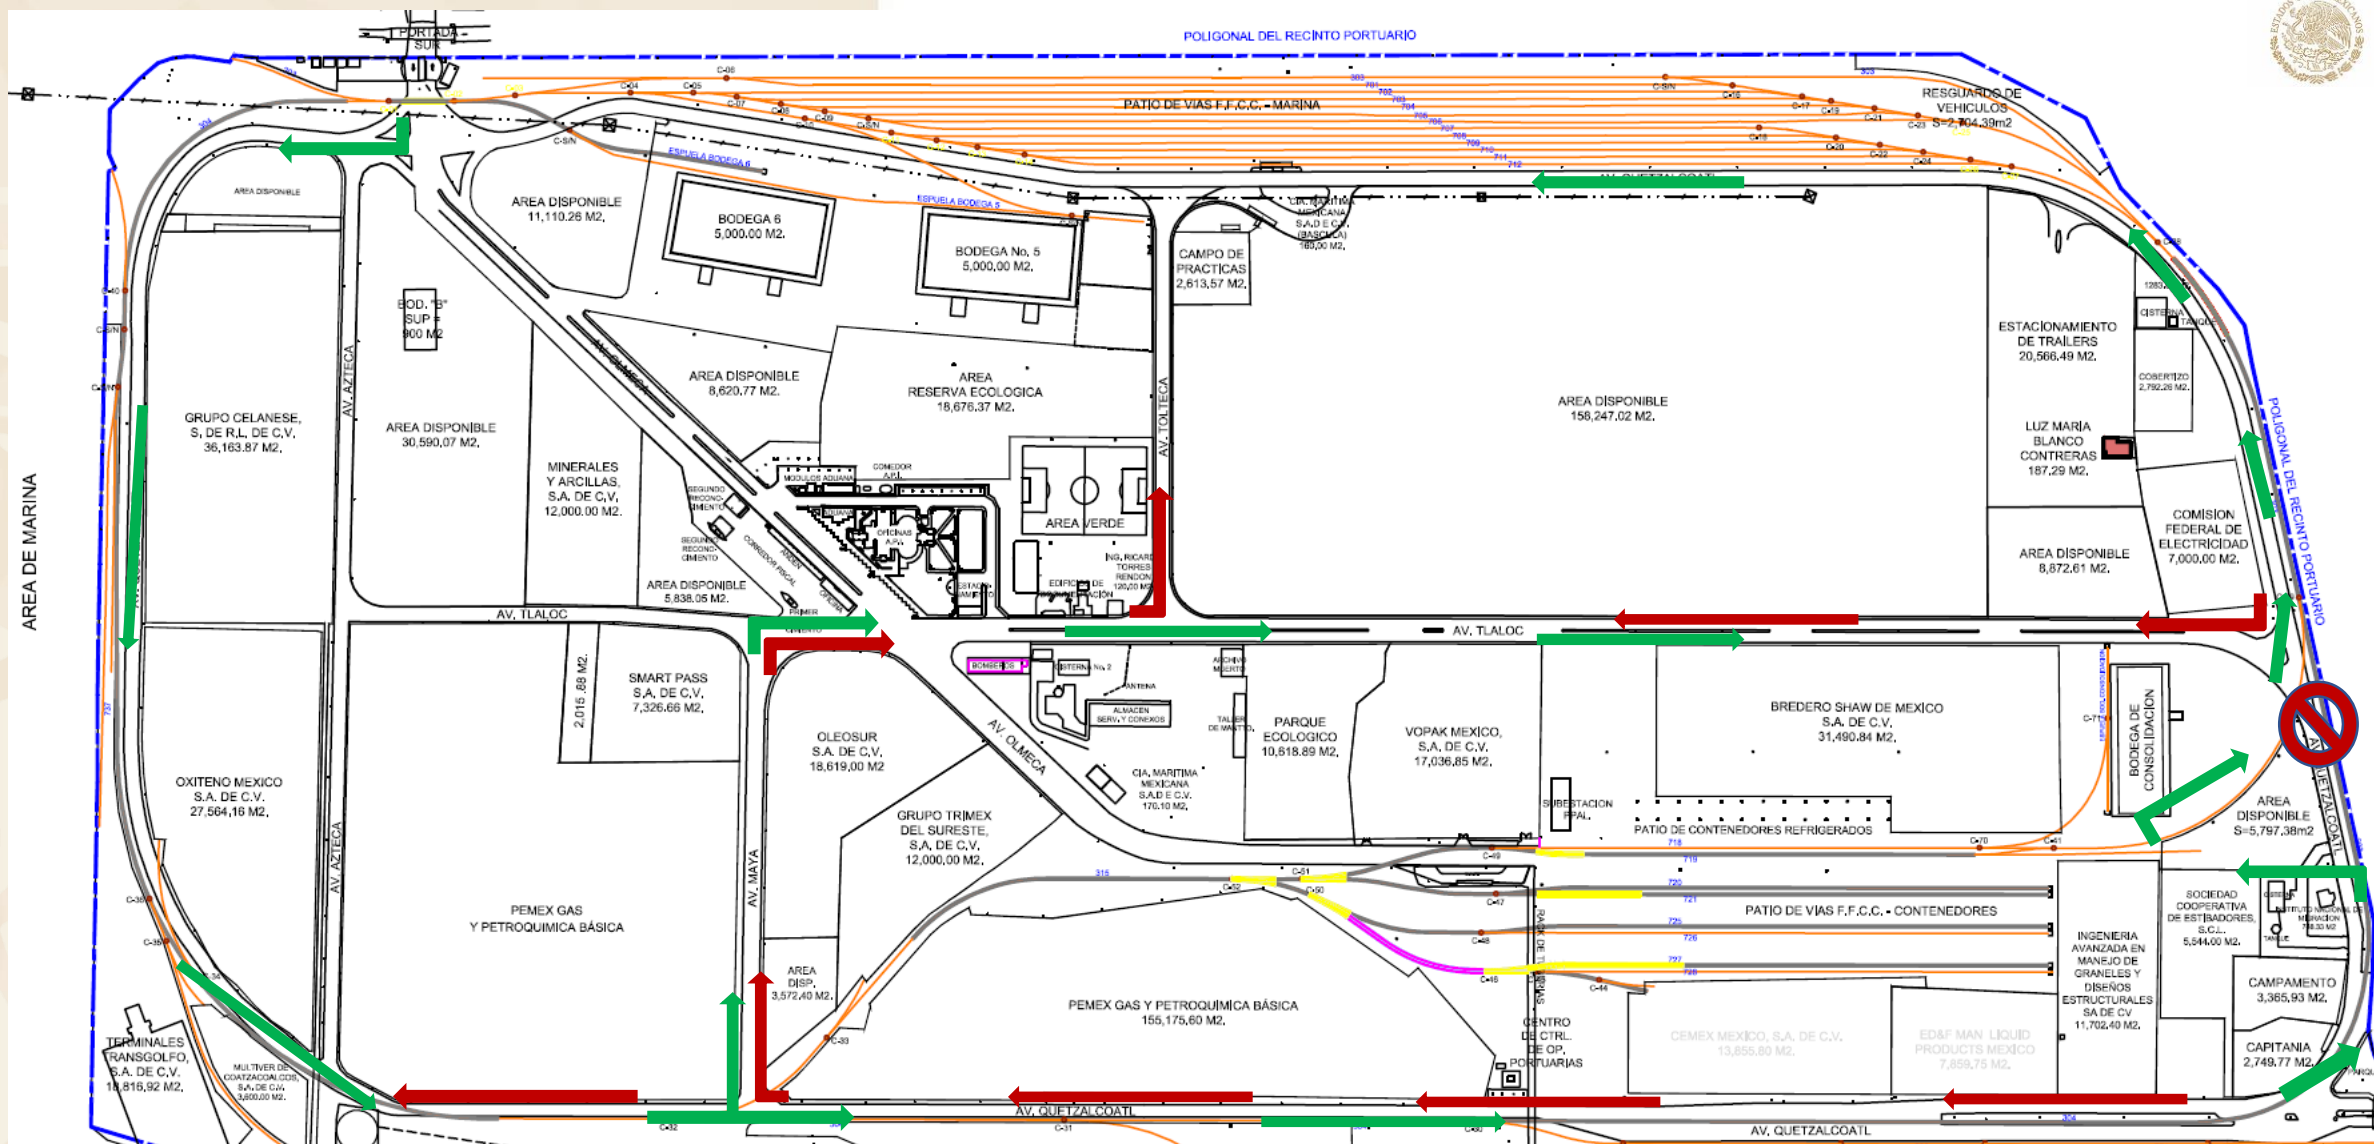

# Rutas alternas por reparación de vía 303
